

TIPO OBRA	CONSTRUCCION	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2026 EDIFICIO CARRERA	N°	18
CODIGO	GIP_228		FECHA INFORME	05-09-2026
M²	11.180,05		REV.	0

1. ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONSTRUCTORA	INGEVEC
DESCRIPCION	EDIFICIO CARRERA
CONTRATO	SUMA ALZADA

FECHA INICIO	11-02-2025
FECHA TERMINO	11-02-2027
PLAZO EJECUCION	730
ATRASO	-

1.1 MONTOS CONTRATO

MONTO TOTAL (IVA INCL.)	UF 350.450,13	100 %
ANTICIPOS	UF 23.928,67	50 %
	UF 23.928,67	50 %
RETENCIONES	UF 17.522,51	5 %
COSTO DIRECTO	UF 266.348,29	
GG	UF 38.519,04	
GASTO DE OFICINA	UF 12.194,69	
UTILIDADES	UF 9.146,02	
MONTO NETO	UF 326.208,05	
PAGADO EN EPS + ANTICIPO	UF 243.428,21	69 %
TOTAL SALDO A PAGAR (IVA INCL.)	UF 107.021,92	31 %
ADICIONALES	UF 2.494,30	1 %

1.2 POLIZA DE SEGURO

AGENCIA SEGUROS: MAPFRE	
N° POLIZA	205-24-00007259
VIGENCIA (Incluye periodo de mantenimiento)	
DESDE	15-10-2024
HASTA	15-02-2028
MATERIA ASEGURADA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	
MONTO	UF 20.000,00
TODO RIESGO DE CONSTRUCCION	
MONTO	UF 350.450,00

1.3 GARANTIAS

BOLETAS DE GARANTIAS					
BANCO	N°	CONCEPTO	VENCIMIENTO	MONTO (UF)	ESTADO
AVLA	3012024201550- 3012024201558	Anticipo (10 Boletas de UF 5.141,39)	22-01-2027	UF 51.413,90	DEVOLUCION BOLETA 4 DE 10.
AVLA	3012024201545	Fiel Cumplimiento de Contrato	19-02-2027	UF 17.522,51	EN PODER DE LA INMOBILIARIA

1.4 LISTADO DE ADICIONALES

DESCRIPCION	CORRELATIVO	PRESENTADO (NETO)	ESTADO	APROBADO (NETO)
REFUERZO MUROS PERIMETRALES DEL PROYECTO		UF 240,55	APROBADO	UF 91,90
CAMBIO DE HORMIGÓN DE G20 A G25		UF 731,44	ELIMINADA	UF 00,00
DEMOLICION VIGA DE CONTENCIÓN Y FUNDACION MURO MEDIANERO		UF 200,39	APROBADO	UF 181,62
CAMBIO DE CANTERÍA DE BAÑO POR CORNISA		-UF 29,65	APROBADO	-UF 32,62
SOBREEXCAVACION Y RELLENOS EN FUNDACIONES		UF 161,40	RECHAZADO	UF 00,00
MODIFICACION DE LOSA DEL 1° SUBTERRANEO		UF 363,00	APROBADO	UF 345,26
EMPALME UD Y ALCANTARILLADO		UF 184,07	APROBADO	UF 184,07
ESTANQUE DE AGUA DE BOMBEROS		UF 412,70	APROBADO	UF 210,27
JUNTA DE DILATACIÓN DE PISCINA		UF 40,96	APROBADO	UF 40,96
MOTOR CORTINA SALA DE VENTAS		UF 59,21	APROBADO	UF 59,21
CAMBIO DE TINA A RECEPTACULO DEPTOS TIPO 1-3-5-8		UF 507,32	APROBADO	UF 507,32
COSTO DIRECTO OBRAS EXTRAORDINARIAS N°5 y N°9		UF 1.500,00	APROBADO	UF 212,68
ESTANQUE DE AGUA DE BOMBEROS		UF 421,70	APROBADO	UF 38,63
COSTOS DIRECTOS OOAA 05 y 09		UF 56,87	APROBADO	UF 42,16
VARIOS VENTANAS		UF 242,52	APROBADO	UF 242,52
ALARMA VENTANAS DORMITORIOS PISO 2		UF 37,71	APROBADO	UF 37,71
CIERRE SEGURIDAD SALA DE VENTAS		UF 14,89	APROBADO	UF 14,89
SALA DE VENTAS		UF 126,31	APROBADO	UF 126,31
VENTANAS LOCALES 9 AL 13		UF 35,88	APROBADO	UF 35,88
			TOTAL NETO	UF 2.338,77
			IVA	19,00 %
			CEEC	65,00 %
			TOTAL	UF 2.494,30

ADIC. A LA FECHA	UF 2.494,30	ADIC. PAGADO A FECHA	UF 2.089,65	TOTAL SALDO POR PAGAR	UF 404,65
------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------	-----------

TIPO OBRA	CONSTRUCCION	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2026 EDIFICIO CARRERA	N°	18
CODIGO	GIP_228		FECHA INFORME	05-09-2026
M²	11.180,05		REV.	0

1.5 ESTADOS DE PAGO ADICIONALES

FECHA	N° EP	FACTURA N°	TOTAL	RETENCIONES	DEVOLUCION ANTICIPO	MONTO PAGO NETO
23-06-2025	1	40770	UF 45,95	UF 00,00		UF 45,95
29-08-2025	2	40985	UF 90,81	UF 00,00		UF 90,81
30-10-2025	3	41211	UF 136,76	UF 00,00		UF 136,76
27-11-2025	4	41350	UF 345,26	UF 00,00		UF 345,26
16-04-2026	5	41796	UF 184,07	UF 00,00		UF 184,07
20-07-2026	6	42274	UF 216,67	UF 00,00		UF 216,67
20-08-2026	7	42373	UF 939,83	UF 00,00		UF 939,83
TOTAL NETO						UF 1.959,35
TOTAL						UF 2.089,65

1.6 ESTADOS DE PAGO ORDINARIO


FECHA	N° EP	FACTURA N°	TOTAL	RETENCIONES	DEVOLUCION ANTICIPO	MONTO PAGO NETO
11-02-2025	ANTICIPO 1 CEEC	40224	UF 22.414,52	UF 00,00	UF 00,00	UF 22.414,52
11-02-2025	ANTICIPO 1 SIN CEEC	40225	UF 1.514,15	UF 00,00	UF 00,00	UF 1.514,15
26-02-2025	ESTADO DE PAGO 1 CEEC	40343	UF 10.065,51	UF 503,28	UF 738,35	UF 8.823,89
24-03-2025	ESTADO DE PAGO 2 CEEC	40401	UF 5.272,05	UF 263,60	UF 386,73	UF 4.621,73
20-04-2025	ESTADO DE PAGO 3 CEEC	40551	UF 10.540,18	UF 527,01	UF 773,16	UF 9.240,01
20-04-2025	NOTA DE CREDITO 1 CEEC	3999	-UF 8.128,07	-UF 406,40	-UF 596,23	-UF 7.125,44
20-05-2025	ANTICIPO 2 CEEC	40643	UF 22.414,52	UF 00,00	UF 00,00	UF 22.414,52
20-05-2025	ANTICIPO 2 SIN CEEC	40644	UF 1.514,15	UF 00,00	UF 00,00	UF 1.514,15
20-05-2025	ESTADO DE PAGO 4 CEEC	40649	UF 3.391,08	UF 169,55	UF 248,75	UF 2.972,78
20-06-2025	ESTADO DE PAGO 5 CEEC	40735	UF 8.165,75	UF 408,29	UF 1.261,44	UF 6.496,03
21-07-2025	ESTADO DE PAGO 6 CEEC	40854	UF 6.866,38	UF 343,32	UF 1.060,71	UF 5.462,35
20-08-2025	ESTADO DE PAGO 7 CEEC	40961	UF 7.636,21	UF 381,81	UF 1.179,63	UF 6.074,77
20-09-2025	ESTADO DE PAGO 8 CEEC	41066	UF 9.273,15	UF 463,66	UF 1.432,50	UF 7.377,00
20-09-2025	ESTADO DE PAGO 1 SIN CEEC	41065	UF 1.161,88	UF 58,09	UF 170,46	UF 933,33
20-10-2025	ESTADO DE PAGO 9 CEEC	41158	UF 8.286,51	UF 414,33	UF 1.280,09	UF 6.592,09
20-10-2025	ESTADO DE PAGO 2 SIN CEEC	41167	UF 1.920,36	UF 96,02	UF 281,73	UF 1.542,61
20-11-2025	ESTADO DE PAGO 10 CEEC	41265	UF 9.856,93	UF 492,85	UF 1.522,68	UF 7.841,40
20-11-2025	ESTADO DE PAGO 3 SIN CEEC	41266	UF 3.008,54	UF 150,43	UF 441,38	UF 2.416,74
20-12-2025	ESTADO DE PAGO 11 CEEC	41414	UF 11.432,82	UF 571,64	UF 1.766,13	UF 9.095,05
20-12-2025	ESTADO DE PAGO 4 SIN CEEC	41413	UF 272,87	UF 13,64	UF 40,03	UF 219,19
20-01-2026	ESTADO DE PAGO 12 CEEC	41499	UF 12.244,28	UF 612,21	UF 1.891,48	UF 9.740,58
20-01-2026	ESTADO DE PAGO 5 SIN CEEC	41500	UF 397,96	UF 19,90	UF 58,38	UF 319,68
20-02-2026	ESTADO DE PAGO 13 CEEC	41616	UF 14.356,50	UF 717,82	UF 2.217,77	UF 11.420,90
20-02-2026	ESTADO DE PAGO 6 SIN CEEC	41615	UF 741,38	UF 37,07	UF 108,77	UF 595,54
20-03-2026	ESTADO DE PAGO 14 CEEC	41709	UF 17.028,34	UF 851,42	UF 2.630,51	UF 13.546,41
20-03-2026	ESTADO DE PAGO 7 SIN CEEC	41710	UF 441,28	UF 22,06	UF 64,74	UF 354,48
20-04-2026	ESTADO DE PAGO 15 CEEC	41951	UF 13.937,56	UF 696,88	UF 2.153,05	UF 11.087,62
20-04-2026	ESTADO DE PAGO 8 SIN CEEC	41952	UF 481,50	UF 24,08	UF 70,64	UF 386,79
20-05-2026	ESTADO DE PAGO 16 CEEC	42049	UF 13.428,33	UF 671,42	UF 2.074,39	UF 10.682,52
20-05-2026	ESTADO DE PAGO 9 SIN CEEC	42048	UF 600,86	UF 30,04	UF 88,15	UF 482,67
20-06-2026	ESTADO DE PAGO 17 CEEC	42172	UF 19.319,30	UF 965,97	UF 2.984,42	UF 15.368,92
20-06-2026	ESTADO DE PAGO 10 SIN CEEC	42171	UF 718,04	UF 35,90	UF 105,34	UF 576,79
20-07-2026	ESTADO DE PAGO 18 CEEC	42271	UF 18.315,51	UF 915,78	UF 2.829,35	UF 14.570,38
20-07-2026	ESTADO DE PAGO 11 SIN CEEC	42269	UF 957,39	UF 47,87	UF 140,46	UF 769,07
20-08-2026	ESTADO DE PAGO 19 CEEC	42372	UF 19.315,21	UF 965,76	UF 2.983,79	UF 15.365,66
20-08-2026	ESTADO DE PAGO 12 SIN CEEC	42371	UF 1.332,72	UF 66,64	UF 195,52	UF 1.070,56
			UF 270.495,66	UF 11.131,92	UF 32.584,29	UF 226.779,45
TOTAL NETO						UF 226.779,45
TOTAL						UF 243.428,21

A LA FECHA	UF 350.450,13	PAGADO A FECHA	UF 243.428,21	TOTAL SALDO POR PAGAR	UF 107.021,92
------------	---------------	----------------	---------------	-----------------------	---------------

TIPO OBRA	CONSTRUCCION	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2026 EDIFICIO CARRERA	N°	18
CODIGO	GIP_228		FECHA INFORME	05-09-2026
M²	11.180,05		REV.	0

2. AVANCES DE LA OBRA

PROGRAMADO A LA FECHA	%	66,66 %	Dias Adelanto / Atraso	5,00
EJECUTADO A LA FECHA	%	67,61 %		

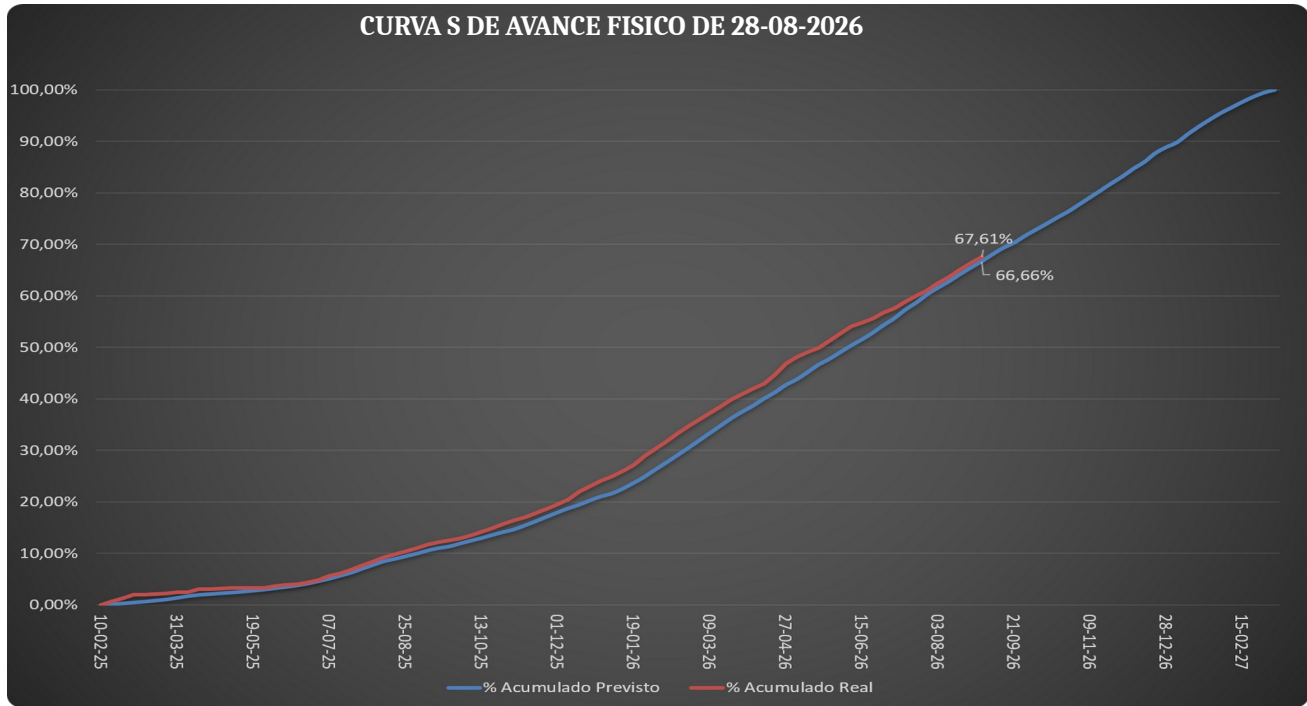

HITOS CONTRACTUALES

1. SELLO DE EXCAVACION	29-05-2025
2. LLEGADA A COTA 0	02-02-2026
3. TERMINO DE OBRA GRUESA	16-09-2026
4. TERMINO DEPTO PILOTO	29-05-2026 (Acuerdo Reunión de Obras).
5. RECEPCION PROVISORIA	Pendiente indicacion de fecha por parte de la Constructora.

HECHOS RELEVANTES AGOSTO 2026

1. CON FECHA 05 DE AGOSTO SE INICIAN TRABAJOS DE YESO PISO 12°.
2. CON FECHA 12 DE AGOSTO SE INICIAN TRABAJOS DE SEGUNDA CARA DE TABIQUERÍA DEL PISO 10°.
3. CON FECHA 19 DE AGOSTO SE INICIAN TRABAJOS DE MUEBLES DE COCINA EN EL PISO 6°.
4. CON FECHA 26 DE AGOSTO SE TERMINAN TRABAJOS DE YESO PROYECTADO PISO 12°.
5. CON FECHA 31 DE AGOSTO SE INICIAN TRABAJOS DE INSTALACION DE VENTANAS EN EL PISO 11°.

TIPO OBRA	CONSTRUCCION	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2026 EDIFICIO CARRERA	N°	18
CODIGO	GIP_228		FECHA INFORME	05-09-2026
M²	11.180,05		REV.	0

3. REGISTRO FOTOGRAFICO al 31.08.2026



FACHADA INTERIOR INICIO DEL MES



FACHADA INTERIOR FINAL DEL MES



INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA PISO 5°




TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS PISO 8°



TRABAJOS EN CUBIERTAS INICIO DEL MES



TRABAJOS EN CUBIERTA FIN DE MES

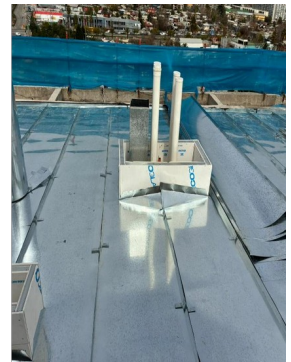

TIPO OBRA	CONSTRUCCION	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2026 EDIFICIO CARRERA	N°	18
CODIGO	GIP_228		FECHA INFORME	05-09-2026
M²	11.180,05		REV.	0

			
TRABAJOS SECTOR DE BOMBEROS		TERMINACION DE DEPARTAMENTOS DEL 3° PISO	

4. CALIDAD DE OBRA

- SE REVISAN TRABAJOS DE PINTURA DE FACHADA INTERIOR.
- SE VERIFICAN LOS TRAZADOS DE TABIQUERÍA DEL 12 PISO.
- SE REALIZA RECEPCION R0 DE DEPARTEMNTOS DEL 2° PISO.
- SE INICIAN PRUEBAS DE HERMETICIDAD EN TERRAZAS DE DEPARTAMENTOS 8° PISO.

5. SEGURIDAD E HIGIENE

- NO SE REGISTRAN ACCIDENTES DURANTE EL MES.

6. ANEXOS

ESTATUS DE RDI	TOTAL	303	RESUELTAS	296
			PENDIENTES	7
			NULAS	0

ANEXO CONTROL PRESUPUESTARIO	SI
-------------------------------------	-----------

CLIENTE: INMOBILIARIA RUTA DESARROLLO CUATRO SPA
EDIFICIO CARRERA



MATERIA: Construcción

		MONTO CONTRATO (UF)	MONTO ACTUALIZADO (UF)	MONTO FACTURADO (UF)	SALDO (UF)
ITEM	Descripción	350.450,13	350.450,13	243.428,21	107.021,92
A.3	Contrato de Construcción Suma Alzada C/IVA 19%	350.450,13	350.450,13	243.428,21	107.021,92
A.4	Modificaciones de obra Construcción	0,00	0,00	0,00	0,00

V°B° **Juan Carlos Neira**
02-10-2026

CLIENTE: INMOBILIARIA RUTA DESARROLLO CUATRO SPA
EDIFICIO CARRERA



MATERIA:	Resumen Contrato
----------	------------------

Resumen del Contrato:	
Tipo de Contrato	SUMA ALZADA
Monto del Contrato (UF) C/ IVA Especial 11,00%	
Monto del Contrato (UF) C/ IVA 19,00%	
Monto Total Contrato C/IVA	350.450,13
Aumentos y Disminuciones	0,00
Anticipo 1 (UF)	23.928,67
Anticipo 2 (UF)	23.928,67
Póliza de Seguros (UF)	17.523
Plazo de Ejecución (Días)	730
Fecha de Inicio	11-02-2025
Fecha de Término	11-02-2027
MONTO ANTICIPO DEVUELTO CONSTRUCTORA	32.584,29

BOLETAS DE GARANTÍAS - EDIFICIO CARRERA						
INSTITUCIÓN	NUMERO BOLETA	CONCEPTO	VENCIMIENTO	MONTO (UF)	Monto Devuelto	OBSERVACION
AVLA	3012024201547	Anticipo	22-01-2027	5.141,39	5.141,39	DEVOLUCION BOLETA 1 DE 10.
AVLA	3012024201548	Anticipo	22-01-2027	5.141,39	5.141,39	DEVOLUCION BOLETA 2 DE 10.
AVLA	3012024201550	Anticipo	22-01-2027	5.141,39	5.141,39	DEVOLUCION BOLETA 3 DE 10.
AVLA	3012024201551	Anticipo	22-01-2027	5.141,39	5.141,39	DEVOLUCION BOLETA 4 DE 10.
AVLA	3012024201552	Anticipo	22-01-2027	5.141,39		
AVLA	3012024201553	Anticipo	22-01-2027	5.141,39		
AVLA	3012024201555	Anticipo	22-01-2027	5.141,39		
AVLA	3012024201556	Anticipo	22-01-2027	5.141,39		
AVLA	3012024201557	Anticipo	22-01-2027	5.141,39		
AVLA	3012024201558	Anticipo	22-01-2027	5.141,39		
AVLA	3012024201545	Fiel Cumplimiento	19-02-2027	17.522,51		EN PODER DE LA INMOBILIARIA

VºBº Juan Carlos Neira
02-10-2026



ESTADOS DE PAGO IVA CREDITO ESPECIAL	
MATERIA: Contrato de Construcción	
Monto Estimado Inicial	
Monto TOTAL Contratado	
Costo Directo	266.348,29
Gastos Generales	38.519,04
Gasto Oficina (4%)	12.194,69
Margen (3%)	9.146,02
Administración Valores Proforma 3%	
Subtotal Neto	326.208,05
IVA NORMAL	19,00 % 61.979,53
CREDITO IVA	65,00 % 37.737,44
TOTAL CONTRATO (IVA INC)	350.450,13

14,46 %
 4,00 %
 3,00 %

47.857,34 Total
 23.928,67 Anticipo 1
 23.928,67 Anticipo 2

	7,34 %	15 %
Etapa 2	5 %	5 %

ESTADO DE PAGO Nº	EMITIDA POR	Nº FACTURA	FECHA EMISIÓN	GLOSA	MONTO BRUTO NETO ESTADO DE PAGO (UF)	DEVOLUCION ANTICIPO 1 14,16% (UF)	DEVOLUCION ANTICIPO 2 14,16% (UF)	RETENCIONES POR CONTRATO (UF)	MONTO NETO ESTADO DE PAGO (UF)	IVA A PAGAR (19%) (UF)	CRED ESP CEEC (65%) (UF)	MONTO ESTADO DE PAGO TOTAL (UF)	Valor UF Dia de la Facturación	MONTO ESTADO DE PAGO NETO (\$)	IVA A PAGAR (19%) (\$)	CRED ESP CEEC (65%) (\$)	MONTO ESTADO DE PAGO TOTAL (\$)
0	CONSTRUCTORA INGEVEC	40224	11-02-2025	ANTICIPO 1 CEEC	22.414,52				22.414,52	4.258,76	2.768,19	23.905,09	38.391,84	860.534.666	163.501.586	106.276.031	917.760.221
1	CONSTRUCTORA INGEVEC	40225	11-02-2025	ANTICIPO 1 SIN CEEC	1.514,15				1.514,15	287,69			1.801,84	38.391,84	58.131.005		69.175.895
2	CONSTRUCTORA INGEVEC	40343	26-02-2025	ESTADO DE PAGO 1 CEEC	10.065,51	738,35		503,28	8.823,89	1.676,54	1.089,75	9.410,68	38.527,33	339.961.047	64.592.599	41.985.189	362.568.457
3	CONSTRUCTORA INGEVEC	40401	24-03-2025	ESTADO DE PAGO 2 CEEC	5.272,05	386,73	-	263,60	4.621,73	878,13	570,78	4.929,07	38.839,02	179.503.260	34.105.619	22.168.652	191.440.227
4	CONSTRUCTORA INGEVEC	40551	20-04-2025	ESTADO DE PAGO 3 CEEC	10.540,18	773,16	-	527,01	9.240,01	1.755,60	1.141,14	9.854,47	39.016,98	360.517.324	68.498.292	44.523.890	384.491.726
5	CONSTRUCTORA INGEVEC	3999	20-04-2025	NOTA DE CREDITO 1 CEEC	- 8.128,07	- 596,23	-	- 406,40	- 7.125,44	- 1.353,83	- 879,99	- 7.599,28	- 39.016,98	- 278.013.013	- 52.822.472	- 34.334.607	- 296.500.878
6	CONSTRUCTORA INGEVEC	40643	20-05-2025	ANTICIPO 2 CEEC	22.414,52				22.414,52	4.258,76	2.768,19	23.905,09	39.161,67	877.790.035	166.780.107	108.407.070	936.163.072
7	CONSTRUCTORA INGEVEC	40644	20-05-2025	ANTICIPO 2 SIN CEEC	1.514,15				1.514,15	287,69			1.801,84	39.161,67	59.296.643		70.563.005
8	CONSTRUCTORA INGEVEC	40649	20-05-2025	ESTADO DE PAGO 4 CEEC	3.391,08	248,75		169,55	2.972,78	564,83	367,14	3.170,47	39.161,67	116.418.873	22.119.586	14.377.731	124.160.728
9	CONSTRUCTORA INGEVEC	40735	20-06-2025	ESTADO DE PAGO 5 CEEC	8.165,75	630,72	630,72	408,29	6.496,03	1.234,24	802,26	6.928,01	39.248,80	254.961.240	48.442.636	31.487.713	271.916.163
10	CONSTRUCTORA INGEVEC	40854	21-07-2025	ESTADO DE PAGO 6 CEEC	6.866,38	530,36	530,36	343,32	5.462,35	1.037,85	674,60	5.825,60	39.229,71	214.286.540	40.714.443	26.464.388	228.536.595
11	CONSTRUCTORA INGEVEC	40961	20-08-2025	ESTADO DE PAGO 7 CEEC	7.636,21	589,82	589,82	381,81	6.074,77	1.154,21	750,23	6.478,74	39.258,06	238.483.666	45.311.897	29.452.733	254.342.830
12	CONSTRUCTORA INGEVEC	41066	20-09-2025	ESTADO DE PAGO 8 CEEC	9.273,15	716,25	716,25	463,66	7.377,00	1.401,63	911,06	7.867,57	39.485,63	291.285.348	55.344.216	35.973.740	310.655.824
13	CONSTRUCTORA INGEVEC	41065	20-09-2025	ESTADO DE PAGO 1 SIN CEEC	1.161,88		170,46	58,09	933,33	177,33		1.110,66	39.485,65	36.853.086	7.002.086		43.855.172
14	CONSTRUCTORA INGEVEC	41158	20-10-2025	ESTADO DE PAGO 9 CEEC	8.286,51	1.280,09		414,33	6.592,09	1.252,50	814,12	7.030,47	39.541,62	260.662.052	49.525.790	32.191.764	277.996.078
15	CONSTRUCTORA INGEVEC	41167	20-10-2025	ESTADO DE PAGO 2 SIN CEEC	1.920,36			281,73	96,02	1.542,61	293,10	1.835,70	39.541,62	60.997.167	11.589.462		72.586.629
16	CONSTRUCTORA INGEVEC	41265	20-11-2025	ESTADO DE PAGO 10 CEEC	9.856,93	1.522,68		492,85	7.841,40	1.489,87	968,41	8.362,85	39.643,59	310.861.247	59.063.637	38.391.364	331.533.520
17	CONSTRUCTORA INGEVEC	41266	20-11-2025	ESTADO DE PAGO 3 SIN CEEC	3.008,54			441,38	150,43	2.416,74	459,18	2.875,92	39.643,59	95.808.137	18.203.546		114.011.683
18	CONSTRUCTORA INGEVEC	41414	20-12-2025	ESTADO DE PAGO 11 CEEC	11.432,82	1.766,13		571,64	9.095,05	1.728,06	1.123,24	9.699,87	39.685,75	360.944.001	68.579.360	44.576.584	384.946.777
19	CONSTRUCTORA INGEVEC	41413	20-12-2025	ESTADO DE PAGO 4 SIN CEEC	272,87		40,03	13,64	219,19	41,65		260,84	39.685,75	6.898.845	1.652.781		10.351.626
20	CONSTRUCTORA INGEVEC	41499	20-01-2026	ESTADO DE PAGO 12 CEEC	12.244,28	1.891,48	-	612,21	9.740,58	1.850,71	1.202,96	10.388,33	39.734,28	387.035.117	73.536.672	47.798.837	412.772.952
21	CONSTRUCTORA INGEVEC	41500	20-01-2026	ESTADO DE PAGO 5 SIN CEEC	397,96		58,38	19,90	319,68	60,74		380,42	39.734,28	12.702.227	2.413.423		15.115.650
22	CONSTRUCTORA INGEVEC	41616	20-02-2026	ESTADO DE PAGO 13 CEEC	14.356,50	2.217,77	-	717,82	11.420,90	2.169,97	1.410,48	12.180,39	39.745,27	453.926.778	86.246.088	56.059.957	484.112.909
23	CONSTRUCTORA INGEVEC	41615	20-02-2026	ESTADO DE PAGO 6 SIN CEEC	741,38		108,77	37,07	595,54	113,15		708,69	39.745,27	23.669.965	4.497.293		28.167.258
24	CONSTRUCTORA INGEVEC	41709	20-03-2026	ESTADO DE PAGO 14 CEEC	17.028,34	2.630,51		851,42	13.546,41	2.573,82	1.672,98	14.447,24	39.841,72	539.712.226	102.545.323	66.654.460	575.603.089
25	CONSTRUCTORA INGEVEC	41710	20-03-2026	ESTADO DE PAGO 7 SIN CEEC	441,28		64,74	22,06	354,48	67,35		421,83	39.841,72	14.123.053	2.683.380		16.806.433
26	CONSTRUCTORA INGEVEC	41951	20-04-2026	ESTADO DE PAGO 15 CEEC	13.937,56	2.153,05		696,88	11.087,62	2.106,65	1.369,32	11.824,95	39.987,35	443.364.711	84.239.295	54.755.542	472.848.464
27	CONSTRUCTORA INGEVEC	41952	20-04-2026	ESTADO DE PAGO 8 SIN CEEC	481,50		70,64	24,08	386,79	73,49		460,28	39.987,35	15.466.641	2.938.662		18.405.303
28	CONSTRUCTORA INGEVEC	42049	20-05-2026	ESTADO DE PAGO 16 CEEC	13.428,33	2.074,39		671,42	10.682,52	2.029,68	1.319,29	11.392,91	40.424,99	431.840.952	82.049.781	53.332.358	460.558.375
29	CONSTRUCTORA INGEVEC	42048	20-05-2026	ESTADO DE PAGO 9 SIN CEEC	600,86		88,15	30,04	482,67	91,71		574,38	40.424,99	19.511.859	3.707.253		23.219.112
30	CONSTRUCTORA INGEVEC	42172	20-06-2026	ESTADO DE PAGO 17 CEEC	19.319,30	2.984,42		965,97	15.368,92	2.920,09	1.898,06	16.390,95	40.793,13	626.946.339	119.119.804	77.427.873	668.638.270
31	CONSTRUCTORA INGEVEC	42171	20-06-2026	ESTADO DE PAGO 10 SIN CEEC	718,04		105,34	35,90	576,79	109,59		686,38	40.793,13	23.529.192	4.470.546		27.999.738
32	CONSTRUCTORA INGEVEC	42271	20-07-2026	ESTADO DE PAGO 18 CEEC	18.315,51	2.829,35		915,78	14.570,38	2.768,37	1.799,44	15.539,31	40.844,79	595.124.259	113.073.609	73.497.846	634.700.022
33	CONSTRUCTORA INGEVEC	42269	20-07-2026	ESTADO DE PAGO 11 SIN CEEC	957,39		140,46	47,87	769,07	146,12		915,19	40.844,79	31.412.739	5.968.352		37.380.731
34	CONSTRUCTORA INGEVEC	42372	20-08-2026	ESTADO DE PAGO 19 CEEC	19.315,21	2.983,79		965,76	15.365,66	2.919,48	1.897,66	16.387,48	40.859,28	627.829.858	119.287.673	77.536.987	669.580.544
35	CONSTRUCTORA INGEVEC	42371	20-08-2026	ESTADO DE PAGO 12 SIN CEEC	1.332,72		195,52	66,64	1.070,56	203,41		1.273,97	40.859,28	43.742.405	8.311.057		52.053.462
				Total Facturado	270.495,66	28.351,56	4.232,74	11.131,92	226.779,45	43.088,10	26.439,34	243.428,21		8.997.919.129	1.709.604.635	1.049.006.102	9.658.517.662

RESUMEN	
Monto total contrato actualizado	350.450,13
Monto Aprobado y Facturado	243.428,21
Saldo por pagar	107.021,92

[Listado de Valores Proforma Construcción](#)

CLIENTE: INMOBILIARIA RUTA DESARROLLO CUATRO SPA
EDIFICIO CARRERA



ESTADOS DE PAGO EXTRAORDINARIOS	
MATERIA: Contrato de Construcción Suma Alzada C/IVA 19%	
Monto Estimado Inicial	1.959,35
Monto TOTAL Contratado	1.959,35
Subtotal Neto	1.959,35
IVA NORMAL 19,00 %	372,28
CREDITO IVA 65,00 %	241,98
TOTAL CONTRATO (IVA INC)	2.089,65

Etapa 1	15 %
Etapa 2	5 %

ESTADO DE PAGO N°	EMITIDA POR	N° FACTURA	FECHA EMISION	FECHA RECEP.	FECHA ENVIO	GLOSA	10,00 %	5 %	19,00 %	65,00 %	TOTAL A PAGAR (UF)	Valor UF Día de la Facturación	MONTO ESTADO DE PAGO NETO (\$)	19,00 %	65,00 %	MONTO ESTADO DE PAGO TOTAL (\$)		
							MONTO BRUTO NETO ESTADO DE PAGO (UF)	DEVOLUCION ANTICIPO (UF)	RETENCIONES POR CONTRATO (UF)	MONTO NETO ESTADO DE PAGO (UF)				IVA A PAGAR UF (19%)	CRED ESP CEEC (65%) (UF)		IVA A PAGAR (\$)	CRED ESP CEEC (65%)
1	CONSTRUCTORA INGEVEC	40770	23-06-2025	23-06-2025	23-06-2025	ESTADO DE PAGO 01 OO.AA.	45,95	-	-	45,95	8,73	5,67	49,01	39.248,77	1.803.481	342.661 -	222.730	1.923.412
2	CONSTRUCTORA INGEVEC	40985	29-08-2025	29-08-2025	29-08-2025	ESTADO DE PAGO 02 OO.AA.	90,81	-	-	90,81	17,25	11,22	96,85	39.360,32	3.574.311	679.119 -	441.427	3.812.002
3	CONSTRUCTORA INGEVEC	41211	24-10-2025	24-10-2025	30-10-2025	ESTADO DE PAGO 03 OO.AA.	136,76	-	-	136,76	25,98	16,89	145,85	39.562,00	5.410.499	1.027.995 -	668.197	5.770.297
4	CONSTRUCTORA INGEVEC	41350	20-11-2025	20-11-2025	27-11-2025	ESTADO DE PAGO 04 OO.AA.	345,26	-	-	345,26	65,60	42,64	368,22	39.643,59	13.687.346	2.600.596 -	1.690.387	14.597.554
5	CONSTRUCTORA INGEVEC	41796	16-04-2026	16-04-2026	16-04-2026	ESTADO DE PAGO 05 OO.AA.	184,07	-	-	184,07	34,97	22,73	196,31	39.841,72	7.333.665	1.393.396 -	905.708	7.821.354
6	CONSTRUCTORA INGEVEC	42274	20-07-2026	20-07-2026	20-07-2026	ESTADO DE PAGO 06 OO.AA.	216,67	-	-	216,67	41,17	26,76	231,08	40.844,79	8.849.841	1.681.470 -	1.092.955	9.438.355
7	CONSTRUCTORA INGEVEC	42373	20-08-2026	20-08-2026	20-08-2026	ESTADO DE PAGO 07 OO.AA.	939,83	-	-	939,83	178,57	116,07	1.002,33	40.859,28	38.400.777	7.296.148 -	4.742.496	40.954.429
8	CONSTRUCTORA INGEVEC							-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Total Facturado							1.959,35	-	-	1.959,35	372,28	241,98	2.089,65		79.059.920	15.021.385 -	9.763.900	84.317.404

RESUMEN	
Monto total contrato actualizado	2.089,65
Monto Aprobado y Facturado	2.089,65
Saldo por pagar	0,00

- Listado de Valores Proforma Construcción
- Listado de Modificaciones de Obra Construcción
- Resumen del Contrato Construcción
- Resumen Construcción
- RESUMEN

VºBº Juan Carlos Neira
02-10-2026

CLIENTE: INMOBILIARIA RUTA DESARROLLO CUATRO SPA
EDIFICIO CARRERA



EDIFICIO CARRERA
MATERIA: LISTADO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES

LISTADO DE MODIFICACIONES DE OBRA CONSTRUCCIÓN					0,00	5.307,27	2.338,77	2.338,77	
Nº	ORIGINADO POR	SOLICITADO POR	ESPECIALIDAD	CONCEPTO	CORRELATIVO	MONTO NETO PRESENTADO POR CONSTRUCTORA (UF)	MONTO NETO APROBADO GIP (UF)	MONTO NETO ACTUALIZADO (UF)	ESTADO
1	INGEVEC	INGEVEC	CALCULO	REFUERZO MUROS PERIMETRALES DEL PROYECTO		240,55	91,90	91,90	APROBADO
2	INGEVEC	INGEVEC	CALCULO	CAMBIO DE HORMIGÓN DE G20 A G25		731,44	-	-	ELIMINADA
3	INGEVEC	INGEVEC	CALCULO	DEMOLICION VIGA DE CONTENCIÓN Y FUNDACION MURO MEDIANERO		200,39	181,62	181,62	APROBADO
4	INGEVEC	INGEVEC	ARQUITECTURA	CAMBIO DE CANTERÍA DE BANO POR CORNISA		29,65	32,62	32,62	APROBADO
5	INGEVEC	INGEVEC	MEC. SUELOS	SOBREEXCAVACION Y RELLENOS EN FUNDACIONES		161,40	-	-	RECHAZADO
6	INGEVEC	INGEVEC	CALCULO	MODIFICACION DE LOSA DEL 1º SUBTERRANEO		363,00	345,26	345,26	APROBADO
7	INGEVEC	INGEVEC	SANITARIO	EMPALME UD Y ALCANTARILLADO		184,07	184,07	184,07	APROBADO
8	INGEVEC	INGEVEC	SANITARIO	ESTANQUE DE AGUA DE BOMBEROS	-	412,70	210,27	210,27	APROBADO
9	INGEVEC	INGEVEC	IMPERMEABILIZACIÓN	JUNTA DE DILATACIÓN DE PISCINA	-	40,96	40,96	40,96	APROBADO
10	INGEVEC	INGEVEC	SALA DE VENTAS	MOTOR CORTINA SALA DE VENTAS	-	59,21	59,21	59,21	APROBADO
		INGEVEC	ARQUITECTURA	CAMBIO DE TINA A RECEPTACULO DEPTOS TIPO 1-3-5-8	-	507,32	507,32	507,32	APROBADO
		INGEVEC	GASTOS GRALES.	COSTO DIRECTO OBRAS EXTRAORDINARIAS N°5 y N°9	-	1.500,00	212,68	212,68	APROBADO
		INGEVEC	BOMBEROS	ESTANQUE DE AGUA DE BOMBEROS	-	421,70	38,63	38,63	APROBADO
		INGEVEC	GASTOS GRALES.	COSTOS DIRECTOS OOAA 05 y 09	-	56,87	42,16	42,16	APROBADO
		INGEVEC	ARQUITECTURA	VARIOS VENTANAS	-	242,52	242,52	242,52	APROBADO
		INGEVEC	ARQUITECTURA	ALARMA VENTANAS DORMITORIOS PISO 2	-	37,71	37,71	37,71	APROBADO
		INGEVEC	VENTAS	CIERRE SEGURIDAD SALA DE VENTAS	-	14,89	14,89	14,89	APROBADO
		INGEVEC	VENTAS	SALA DE VENTAS	-	126,31	126,31	126,31	APROBADO
		INGEVEC	ARQUITECTURA	VENTANAS LOCALES 9 AL 13	-	35,88	35,88	35,88	APROBADO

VºBº Juan Carlos Neira
02-10-2026

CLIENTE: INMOBILIARIA RUTA DESARROLLO CUATRO SPA
EDIFICIO CARRERA



Construcción MATERIA: Valores Proforma
--

[illegible]

V°B° GIP
02-10-2026
