



Informe ejecutivo N° 19, revisión 0

Edificio Carrera

Septiembre 2026

Cierre del período: 30-09-2026 · Emitido el
05-10-2026

Cliente

**Inmobiliaria Ruta
Desarrollo Cuatro SpA**

Constructora

Ingevec

Tipo de contrato

Suma alzada

Código de proyecto

GIP_228

Superficie

11.180,05 m²


Plazo contractual

**11-02-2025 al
05-03-2027**



Dónde está la obra al cierre de septiembre 2026

Con el 79,3% del plazo transcurrido, la obra lleva 72,5% ejecutado: +0,87 pp sobre el programa, equivalente a 5 días de adelanto. Lo certificado en estados de pago (73,9%) va 1,45 pp sobre el avance físico.

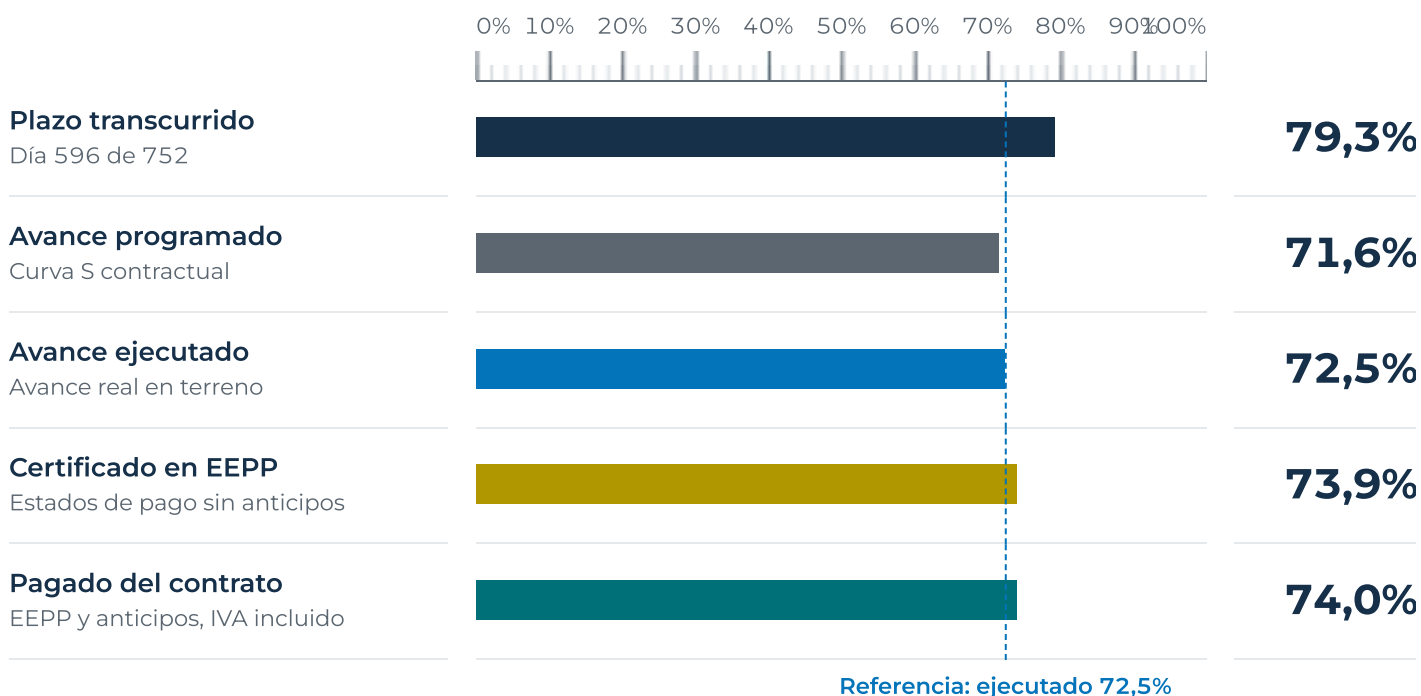

Semáforo de gestión

Verde	Avance físico vs programa Ejecutado 72,5% vs programado 71,6% (+0,87 pp, 5 días de adelanto)
Verde	Avance certificado en EEPP vs físico Certificado en estados de pago 73,9% vs avance físico 72,5% (+1,45 pp)
Amarillo	Consumo de plazo Plazo transcurrido 79,3% con avance físico 72,5% (0,91x), con el aumento de 22 días incluido
Amarillo	Hitos contractuales Obra gruesa terminada el 23-04-2026, 48 días antes de lo programado (10-06-2026); recepción provisoria sin fecha informada por la constructora
Amarillo	Vigencia de garantías Boletas de anticipo (22-01-2027) y de fiel cumplimiento (19-02-2027) vencen antes del nuevo término, 05-03-2027
Verde	Obras adicionales Aprobados UF 2.338,77 netos (0,72% del contrato neto); saldo por pagar UF 233,62
Verde	Cierre de RDI Tasa de cierre 96,0%, con 13 pendientes de 324
Amarillo	Seguridad Un accidente el 08-09 con 7 días perdidos; la obra acumula 2 accidentes y 7 días perdidos

Contrato y garantías

Contrato a suma alzada con Ingevec, por 350.450 UF IVA incluido y un plazo de 752 días, que incluye un aumento de 22 días. Restan 156 días para el término.

Cliente	Inmobiliaria Ruta Desarrollo Cuatro SpA	Fecha de inicio	11-02-2025
Constructora	Ingevec	Fecha de término	05-03-2027
Descripción de la obra	Edificio Carrera	Plazo de ejecución	752 días
Tipo de contrato	Suma alzada	Aumento de plazo	22 días (término original 11-02-2027)
Tipo de obra	Construcción	Días restantes	156 días
Código	GIP_228	Plazo transcurrido	79,3%
Superficie	11.180,05 m²	Atraso	Sin atraso
		Monto del contrato (IVA incl.)	350.450,13 UF

Composición del monto contratado

Concepto	UF	% del neto
Costo directo	266.348,29	81,6%
Gastos generales	38.519,04	11,8%
Gasto de oficina (4%)	12.194,69	3,7%
Utilidades (3%)	9.146,02	2,8%
Monto neto	326.208,05	100,0%
IVA (19%)	61.979,53	19,0%
Crédito especial empresas constructoras (CEEC)	-37.737,44	-11,6%
Monto total del contrato (IVA incl.)	350.450,13	107,4%

Pólizas de seguro

Aseguradora	N° de póliza	Materia asegurada	Monto	Vigencia
Mapfre	205-24-00007259	Responsabilidad civil	20.000 UF	15-10-2024 al 15-02-2028
Mapfre	205-24-00007259	Todo riesgo de construcción	350.450 UF	15-10-2024 al 15-02-2028

La vigencia incluye el período de mantenimiento.

Garantías y retenciones

Anticipo otorgado (neto) 47.857,34 UF Dos anticipos de 23.928,67 UF	Anticipo amortizado 74,0% 35.434,86 UF devueltos en EEPP	Por amortizar 12.422,48 UF Saldo neto del anticipo	Retenido a la fecha 12.059,16 UF 68,8% de la retención contractual
--	---	---	---

6 de 10 boletas de anticipo vigentes (30.848,34 UF). 4 boletas devueltas a la constructora a medida que se amortiza el anticipo.

Institución	Nº de boleta	Concepto	Vencimiento	Monto	Estado
AVLA	3012024201547 a 3012024201558	Anticipo (10 boletas de 5.141,39 UF)	22-01-2027	51.413,90 UF	4 devueltas, 6 vigentes
AVLA	3012024201545	Fiel cumplimiento de contrato	19-02-2027	17.522,51 UF	En poder de la inmobiliaria
—	—	Retención contractual (5% del monto total)	—	17.522,51 UF	12.059,16 UF retenidos a la fecha


La boleta de fiel cumplimiento vence 14 días antes del término contractual (05-03-2027) y las de anticipo vencen 42 días antes. Las retenciones se devuelven contra recepción provisoria y recepción definitiva.

Avance físico

Ejecutado 72,49% contra 71,62% programado: 5 días de adelanto. El ritmo físico respecto del plazo consumido es 0,91x.

- Verde: avance físico vs programa
- Amarillo: consumo de plazo

Programado a la fecha 71,62% Curva S contractual	Ejecutado a la fecha 72,49% Avance real en terreno	Desviación +0,87 pp 5 días de adelanto	Ritmo físico / plazo 0,91x Avance ejecutado sobre plazo transcurrido
---	---	---	---

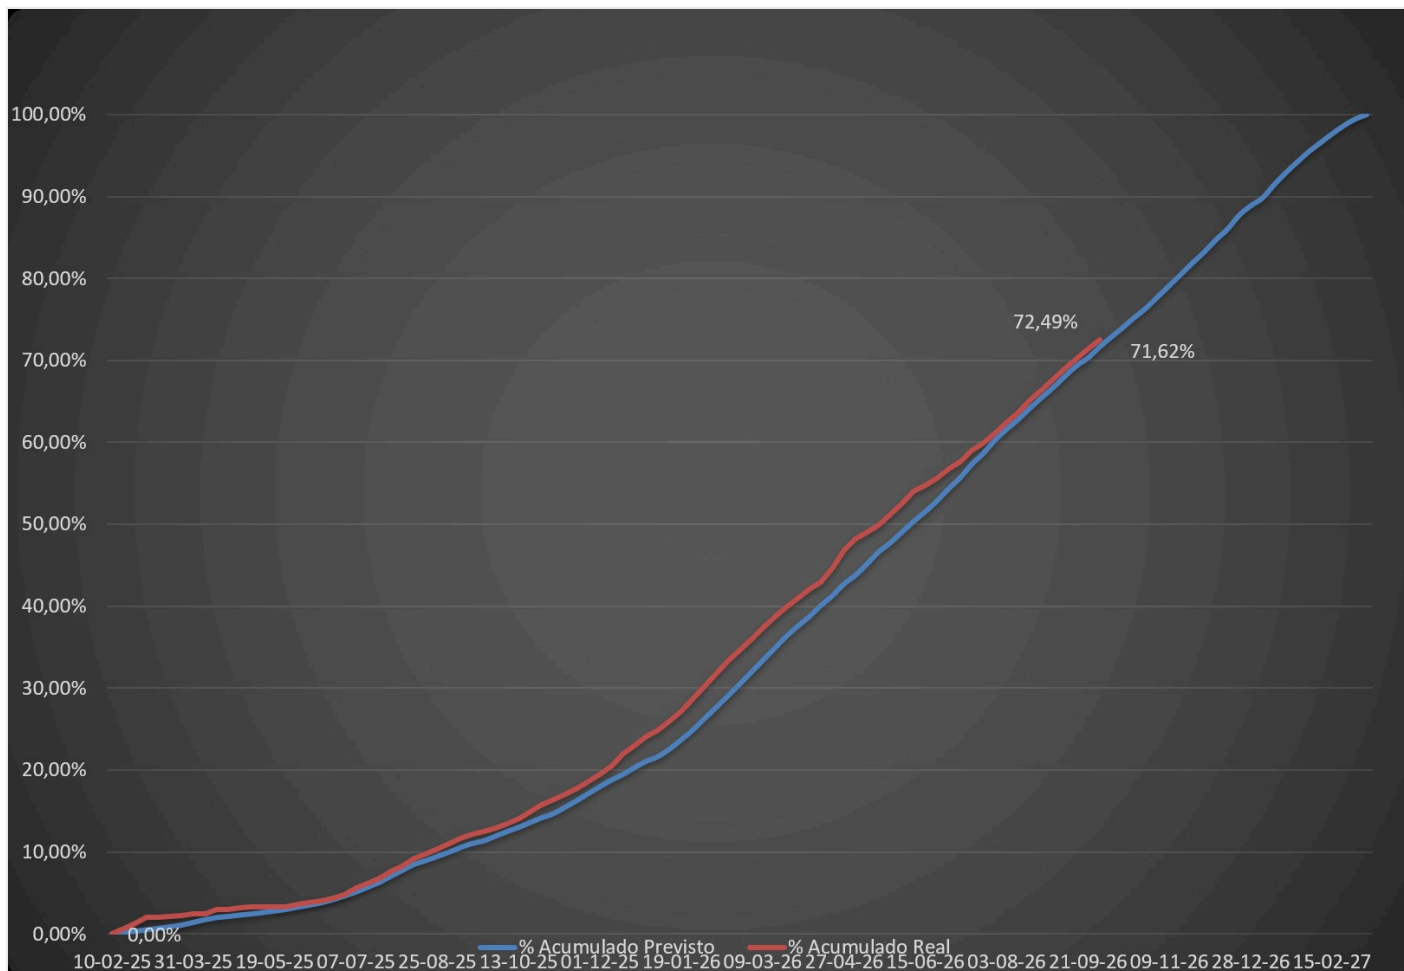

Curva S de avance físico al cierre del período. Azul: % acumulado previsto. Rojo: % acumulado real.

El avance real se mantiene sobre la línea prevista. Al cierre quedan 27,51% de obra por ejecutar en 156 días.

Estado financiero del contrato

Se ha pagado el 74,0% del contrato (259.358 UF IVA incluido, con 51.414 UF de anticipos). Quedan 91.092 UF por pagar.

● Verde: avance certificado en EEPP vs físico

14,7%	59,3%	26,0%
Anticipos	Estados de pago	Saldo por pagar
51.414 UF	207.945 UF	91.092 UF
14,7% del contrato	59,3% del contrato	26,0% del contrato

Detalle del contrato

Concepto	UF	Pesos	% del contrato
Monto total del contrato (IVA incl.)	350.450,13 UF	—	100,0%
Monto neto del contrato	326.208,05 UF	—	93,1%
Anticipos facturados (IVA incl.)	51.413,85 UF	—	14,7%
Estados de pago facturados (IVA incl., neto de devoluciones y retenciones)	207.944,65 UF	—	59,3%
Pagado en estados de pago y anticipos	259.358,50 UF	\$ 10.311.267.720	74,0%
Saldo por pagar (IVA incl.)	91.091,63 UF	—	26,0%
Obras adicionales a la fecha (IVA incl.)	2.494,30 UF	—	0,7%

El saldo por pagar incluye las retenciones acumuladas (12.059,16 UF netas), que se devuelven contra recepción.

Avance físico frente al financiero

Indicador	Valor	Referencia
Avance programado a la fecha	71,62%	Curva S contractual
Avance ejecutado a la fecha	72,49%	Avance real en terreno
Desviación física	+0,87 pp	Adelanto de 5 días
Avance certificado en estados de pago	73,94%	241.183 UF brutos en EEPP, sin anticipos, sobre el monto neto
Brecha certificado vs físico	+1,45 pp	Dentro de ±2 pp
Anticipo amortizado	74,0%	Devolución proporcional en cada estado de pago
Pagado del contrato (EEPP y anticipos)	74,01%	IVA incluido
Plazo transcurrido	79,3%	Día 596 de 752
Ritmo de avance respecto del plazo	0,91x	Bajo 1,00x el consumo de plazo supera al avance físico


Estados de pago

En el período se cursaron EEPP 20 CEEC (factura N° 42495) y EEPP 13 sin CEEC (factura N° 42494), por 15.930,29 UF IVA incluido (\$ 652.750.058).

Los estados de pago se facturan en dos series: con crédito especial a empresas constructoras (CEEC) y sin él.

EEPP con CEEC 20 Último emitido: EEPP 20 CEEC	EEPP sin CEEC 13 Facturados en paralelo desde sep-2025	Anticipos cursados 2 47.857,34 UF netos	Facturado en el período 15.930,29 UF \$ 652.750.058
--	---	--	--

Facturado por mes y pagado acumulado

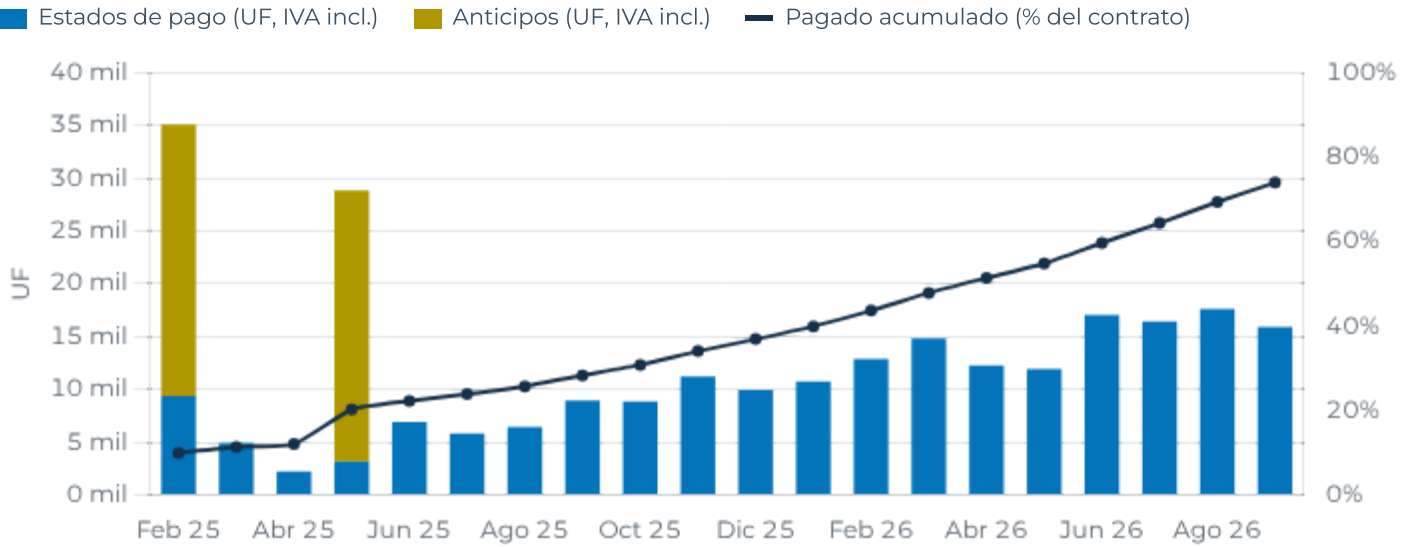

Abril de 2025 incluye la nota de crédito 1 CEEC (-7.599,28 UF), descontada del EEPP 3 del mismo mes.

Concepto	UF	Detalle
Monto bruto facturado	289.040,47	Estados de pago y anticipos
Devolución de anticipos	-35.434,86	74,0% del anticipo amortizado
Retenciones	-12.059,16	5% de cada estado de pago
Monto neto	241.546,45	
IVA (19%)	45.893,83	
Crédito especial CEEC (65% del IVA)	-28.081,78	Solo en la serie con CEEC
Total pagado (IVA incl.)	259.358,50	74,01% del contrato · \$ 10.311.267.720

Detalle de los 38 documentos de pago

Documento	Fecha	Factura	Bruto (UF)	Dev. anticipo	Retención	Total c/IVA (UF)	Acum. % contrato
Anticipo 1 CEEC	11-02-2025	40224	22.414,52	—	—	23.905,09	6,8%

Documento	Fecha	Factura	Bruto (UF)	Dev. anticipo	Retención	Total c/IVA (UF)	Acum. % contrato
Anticipo 1 sin CEEC	11-02-2025	40225	1.514,15	—	—	1.801,84	7,3%
EEPP 1 CEEC	26-02-2025	40343	10.065,52	738,35	503,28	9.410,68	10,0%
EEPP 2 CEEC	24-03-2025	40401	5.272,05	386,73	263,60	4.929,07	11,4%
EEPP 3 CEEC	20-04-2025	40551	10.540,18	773,16	527,01	9.854,47	14,2%
Nota de crédito 1 CEEC	20-04-2025	3999	-8.128,07	-596,23	-406,40	-7.599,28	12,1%
Anticipo 2 CEEC	20-05-2025	40643	22.414,52	—	—	23.905,09	18,9%
Anticipo 2 sin CEEC	20-05-2025	40644	1.514,15	—	—	1.801,84	19,4%
EEPP 4 CEEC	20-05-2025	40649	3.391,08	248,75	169,55	3.170,47	20,3%
EEPP 5 CEEC	20-06-2025	40735	8.165,75	1.261,44	408,29	6.928,01	22,3%
EEPP 6 CEEC	21-07-2025	40854	6.866,38	1.060,71	343,32	5.825,60	24,0%
EEPP 7 CEEC	20-08-2025	40961	7.636,21	1.179,63	381,81	6.478,74	25,8%
EEPP 8 CEEC	20-09-2025	41066	9.273,15	1.432,50	463,66	7.867,57	28,0%
EEPP 1 sin CEEC	20-09-2025	41065	1.161,88	170,46	58,09	1.110,66	28,4%
EEPP 9 CEEC	20-10-2025	41158	8.286,51	1.280,09	414,33	7.030,47	30,4%
EEPP 2 sin CEEC	20-10-2025	41167	1.920,36	281,73	96,02	1.835,70	30,9%
EEPP 10 CEEC	20-11-2025	41265	9.856,93	1.522,68	492,85	8.362,85	33,3%
EEPP 3 sin CEEC	20-11-2025	41266	3.008,54	441,38	150,43	2.875,92	34,1%
EEPP 11 CEEC	20-12-2025	41414	11.432,82	1.766,13	571,64	9.699,87	36,9%
EEPP 4 sin CEEC	20-12-2025	41413	272,87	40,03	13,64	260,84	36,9%
EEPP 12 CEEC	20-01-2026	41499	12.244,28	1.891,48	612,21	10.388,33	39,9%
EEPP 5 sin CEEC	20-01-2026	41500	397,96	58,38	19,90	380,42	40,0%
EEPP 13 CEEC	20-02-2026	41616	14.356,50	2.217,77	717,82	12.180,39	43,5%
EEPP 6 sin CEEC	20-02-2026	41615	741,38	108,77	37,07	708,69	43,7%
EEPP 14 CEEC	20-03-2026	41709	17.028,34	2.630,51	851,42	14.447,25	47,8%
EEPP 7 sin CEEC	20-03-2026	41710	441,28	64,74	22,06	421,83	47,9%
EEPP 15 CEEC	20-04-2026	41951	13.937,56	2.153,05	696,88	11.824,95	51,3%
EEPP 8 sin CEEC	20-04-2026	41952	481,50	70,64	24,08	460,28	51,4%
EEPP 16 CEEC	20-05-2026	42049	13.428,33	2.074,39	671,42	11.392,91	54,7%

Documento	Fecha	Factura	Bruto (UF)	Dev. anticipo	Retención	Total c/IVA (UF)	Acum. % contrato
EEPP 9 sin CEEC	20-05-2026	42048	600,86	88,15	30,04	574,38	54,9%
EEPP 17 CEEC	20-06-2026	42172	19.319,30	2.984,42	965,97	16.390,95	59,5%
EEPP 10 sin CEEC	20-06-2026	42171	718,04	105,34	35,90	686,38	59,7%
EEPP 18 CEEC	20-07-2026	42271	18.315,51	2.829,35	915,78	15.539,31	64,2%
EEPP 11 sin CEEC	20-07-2026	42269	957,39	140,46	47,87	915,19	64,4%
EEPP 19 CEEC	20-08-2026	42372	19.315,21	2.983,79	965,76	16.387,48	69,1%
EEPP 12 sin CEEC	20-08-2026	42371	1.332,72	195,52	66,64	1.273,97	69,5%
EEPP 20 CEEC	20-09-2026	42495	16.717,49	2.582,49	835,87	14.183,52	73,5%
EEPP 13 sin CEEC	20-09-2026	42494	1.827,32	268,08	91,37	1.746,77	74,0%
Total			289.040,47	35.434,86	12.059,16	259.358,50	74,0%

Fuente: anexo A.3, estados de pago con IVA crédito especial, visado por GIP.

Obras adicionales

La constructora ha presentado 19 adicionales por 5.307,27 UF netos y se han aprobado 2.338,77 UF (44,1% de lo presentado). En el período se cursó el EEPP OO.AA. 08 por 171,03 UF IVA incluido.

● Verde: obras adicionales

Presentado (neto) 5.307,27 UF 19 solicitudes	Aprobado (neto) 2.338,77 UF 0,72% del contrato neto	Total con IVA y CEEC 2.494,30 UF 0,71% del contrato	Saldo por pagar 233,62 UF Pagado 2.260,68 UF
---	--	--	---

● 17 aprobados ● 1 rechazado ● 1 eliminado

N°	Especialidad	Concepto	Presentado (UF)	Aprobado (UF)	% aprobado	Estado
1	Cálculo	Refuerzo de muros perimetrales del proyecto	240,55	91,90	38%	Aprobado
2	Cálculo	Cambio de hormigón de G20 a G25	731,44	0,00	—	Eliminado
3	Cálculo	Demolición de viga de contención y fundación de muro medianero	200,39	181,62	91%	Aprobado

N°	Especialidad	Concepto	Presentado (UF)	Aprobado (UF)	% aprobado	Estado
4	Arquitectura	Cambio de cantería de baño por cornisa	-29,65	-32,62	—	Aprobado
5	Mecánica de suelos	Sobreexcavación y rellenos en fundaciones	161,40	0,00	—	Rechazado
6	Cálculo	Modificación de losa del 1° subterráneo	363,00	345,26	95%	Aprobado
7	Sanitario	Empalme UD y alcantarillado	184,07	184,07	100%	Aprobado
8	Sanitario	Estanque de agua de bomberos	412,70	210,27	51%	Aprobado
9	Impermeabilización	Junta de dilatación de piscina	40,96	40,96	100%	Aprobado
10	Sala de ventas	Motor de cortina de sala de ventas	59,21	59,21	100%	Aprobado
11	Arquitectura	Cambio de tina a receptáculo en deptos. tipo 1, 3, 5 y 8	507,32	507,32	100%	Aprobado
12	Gastos generales	Costo directo de obras extraordinarias N° 5 y N° 9	1.500,00	212,68	14%	Aprobado
13	Bomberos	Estanque de agua de bomberos	421,70	38,63	9%	Aprobado
14	Gastos generales	Costos directos OO.AA. 05 y 09	56,87	42,16	74%	Aprobado
15	Arquitectura	Varios ventanas	242,52	242,52	100%	Aprobado
16	Arquitectura	Alarma de ventanas de dormitorios piso 2	37,71	37,71	100%	Aprobado
17	Ventas	Cierre de seguridad sala de ventas	14,89	14,89	100%	Aprobado
18	Ventas	Sala de ventas	126,31	126,31	100%	Aprobado
19	Arquitectura	Ventanas locales 9 al 13	35,88	35,88	100%	Aprobado
Total neto			5.307,27	2.338,77	44%	

Montos netos en UF. Al aprobado neto se suma IVA (444,37 UF) y se descuenta el crédito CEEC (288,84 UF), para un total de 2.494,30 UF.

Estados de pago de obras adicionales

Documento	Fecha	Factura	Neto (UF)	IVA	Crédito CEEC	Total (UF)
EEPP OO.AA. 01	23-06-2025	40770	45,95	8,73	-5,67	49,01
EEPP OO.AA. 02	29-08-2025	40985	90,81	17,25	-11,22	96,85
EEPP OO.AA. 03	24-10-2025	41211	136,76	25,98	-16,89	145,85
EEPP OO.AA. 04	20-11-2025	41350	345,26	65,60	-42,64	368,22

Documento	Fecha	Factura	Neto (UF)	IVA	Crédito CEEC	Total (UF)
EEPP OO.AA. 05	16-04-2026	41796	184,07	34,97	-22,73	196,31
EEPP OO.AA. 06	20-07-2026	42274	216,67	41,17	-26,76	231,08
EEPP OO.AA. 07	20-08-2026	42373	939,83	178,57	-116,07	1.002,33
EEPP OO.AA. 08	20-09-2026	42497	160,37	30,47	-19,81	171,03
Total			2.119,72	402,75	-261,79	2.260,68

Requerimientos de información (RDI)

De 324 RDI emitidas, 311 están resueltas (96,0%). Quedan 13 pendientes de respuesta.

● Verde: cierre de RDI

RDI emitidas 324 Al 30-09-2026	Resueltas 311 Tasa de cierre 96,0%	Pendientes 13 4,0% del total	Nulas 0
---	---	---	-------------------

Estado de las RDI

Resueltas		311 96,0%
Pendientes		13 4,0%
Nulas		0 0,0%

Calidad y seguridad

Se terminó la revisión de impermeabilización del piso 8, se recibieron en R0 14 departamentos del piso 3 y se resolvieron en terreno las observaciones a cornisas de pasillos comunes. Hubo un accidente con 7 días perdidos.

Revisiones de calidad del período

- Se termina la revisión de impermeabilización del piso 8 y se inicia la del piso 10.
- Se realiza la recepción R0 de departamentos del piso 3, con 14 departamentos revisados al 29-09.
- Se revisan y solucionan en terreno, junto a arquitectura, las observaciones a cornisas de pasillos comunes.
- Se solicita a la constructora revisar las terminaciones de junquillos y sellos de puertas correderas.

Seguridad e higiene

Accidentes en el mes

1

Septiembre 2026

Días perdidos en el mes

7

Accidentes acumulados

2

Desde el inicio de la obra

Días perdidos acumulados

7

El 08-09 se accidenta un carpintero mientras desarmaba un andamio, con 7 días perdidos. A la fecha la obra registra dos accidentes y 7 días perdidos.

Hitos y hechos relevantes


La obra gruesa terminó el 23-04-2026, 48 días antes de la fecha programada (10-06-2026). La recepción provisoria aún no tiene fecha informada por la constructora.

Hitos contractuales



Los hitos rellenos están cumplidos y se ubican en su fecha real. Los hitos en azul tienen fecha comprometida anterior al cierre del período, sin fecha real registrada en el informe.

Hechos relevantes de septiembre 2026

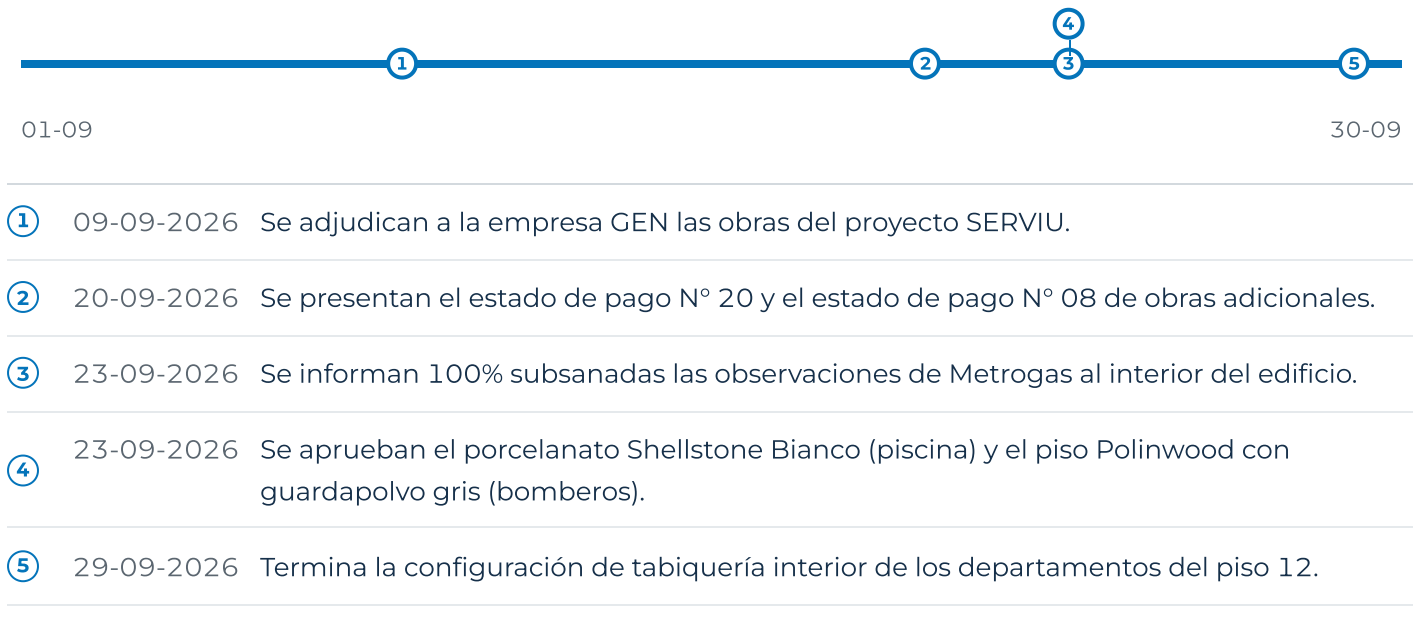


Registro fotográfico al 30-09-2026

8 fotografías del período. Las comparaciones muestran el mismo frente al inicio y al final del mes. Seleccione una foto para ampliarla.

Avance durante el mes

Fachada interior

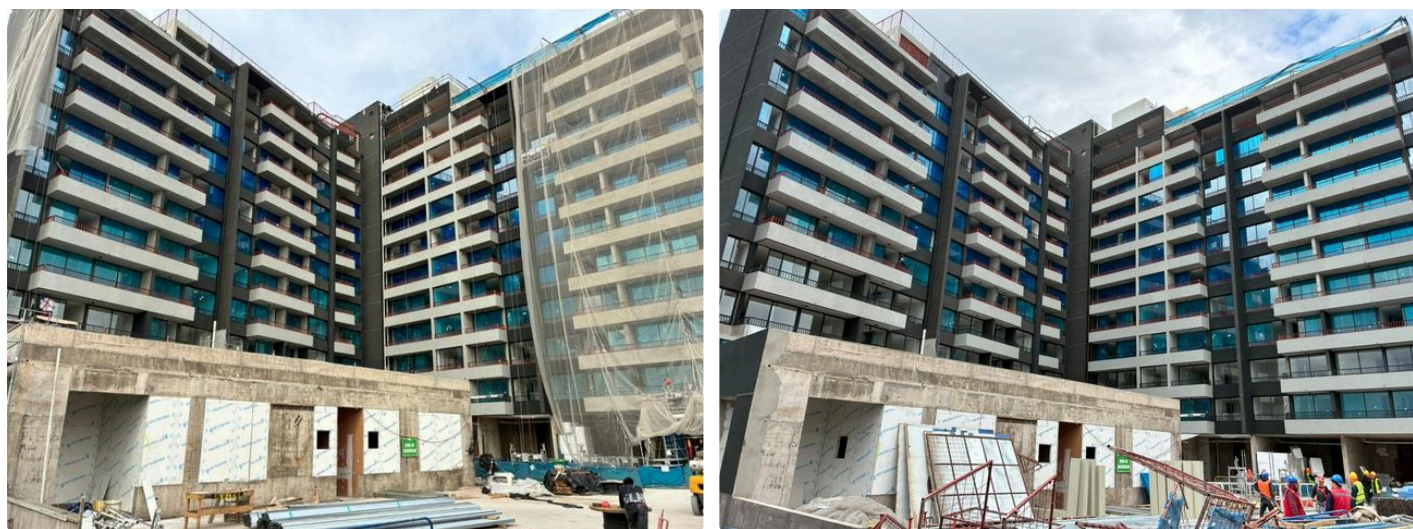

Inicio del mes

Final del mes

Cubierta



Inicio del mes




Final del mes


Faenas del período




Pisos 6 y 7
Instalación de muebles de cocina

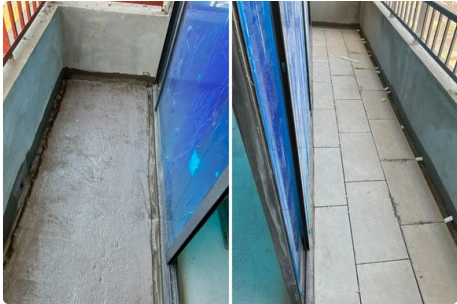

Pisos 9 y 10
Impermeabilización y cerámica de terrazas

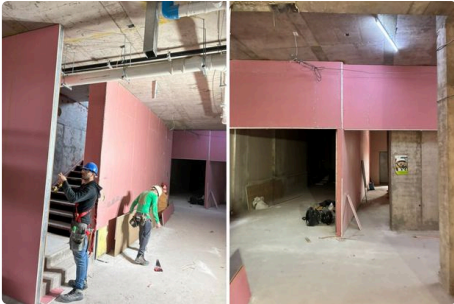

Piso 1
Tabiquería de locales y sector bomberos

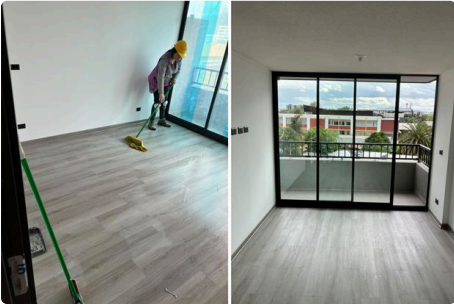

Piso 4
Terminación de departamentos



INSPECCIÓN TÉCNICA
DE OBRAS

GIP Inspección Técnica de Obras

Av. Vitacura 5250, oficina 507, Vitacura, Santiago
contacto@gip.cl

Informe ejecutivo N° 19, revisión 0

Edificio Carrera (GIP_228)

Período septiembre 2026, cierre 30-09-2026
