

|           |              |                                                          |               |            |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|
| TIPO OBRA | CONSTRUCCION | INFORME EJECUTIVO<br>SEPTIEMBRE 2026<br>EDIFICIO CARRERA | N°            | 19         |
| CODIGO    | GIP_228      |                                                          | FECHA INFORME | 05-10-2026 |
| M²        | 11.180,05    |                                                          | REV.          | 0          |

## 1. ANTECEDENTES DE CONTRATO

|              |                  |
|--------------|------------------|
| CONSTRUCTORA | INGEVEC          |
| DESCRIPCION  | EDIFICIO CARRERA |
| CONTRATO     | SUMA ALZADA      |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| FECHA INICIO    | 11-02-2025 |
| FECHA TERMINO   | 05-03-2027 |
| PLAZO EJECUCION | 752        |
| ATRASO          | -          |

### 1.1 MONTOS CONTRATO

|                                 |               |       |
|---------------------------------|---------------|-------|
| MONTO TOTAL (IVA INCL.)         | UF 350.450,13 | 100 % |
| ANTICIPOS                       | UF 23.928,67  | 50 %  |
|                                 | UF 23.928,67  | 50 %  |
| RETENCIONES                     | UF 17.522,51  | 5 %   |
| COSTO DIRECTO                   | UF 266.348,29 |       |
| GG                              | UF 38.519,04  |       |
| GASTO DE OFICINA                | UF 12.194,69  |       |
| UTILIDADES                      | UF 9.146,02   |       |
| MONTO NETO                      | UF 326.208,05 |       |
| PAGADO EN EPS + ANTICIPO        | UF 259.358,50 | 74 %  |
| TOTAL SALDO A PAGAR (IVA INCL.) | UF 91.091,63  | 26 %  |
| ADICIONALES                     | UF 2.494,30   | 1 %   |

### 1.2 POLIZA DE SEGURO

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| AGENCIA SEGUROS: MAPFRE                     |                 |
| N° POLIZA                                   | 205-24-00007259 |
| VIGENCIA (Incluye periodo de mantenimiento) |                 |
| DESDE                                       | 15-10-2024      |
| HASTA                                       | 15-02-2028      |
| MATERIA ASEGURADA                           |                 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL                       |                 |
| MONTO                                       | UF 20.000,00    |
| TODO RIESGO DE CONSTRUCCION                 |                 |
| MONTO                                       | UF 350.450,00   |

### 1.3 GARANTIAS

| BOLETAS DE GARANTIAS |                              |                                      |             |              |                             |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| BANCO                | N°                           | CONCEPTO                             | VENCIMIENTO | MONTO (UF)   | ESTADO                      |
| AVLA                 | 3012024201550- 3012024201558 | Anticipo (10 Boletas de UF 5.141,39) | 22-01-2027  | UF 51.413,90 | DEVOLUCION BOLETA 4 DE 10.  |
| AVLA                 | 3012024201545                | Fiel Cumplimiento de Contrato        | 19-02-2027  | UF 17.522,51 | EN PODER DE LA INMOBILIARIA |

### 1.4 LISTADO DE ADICIONALES

| DESCRIPCION                                              | CORRELATIVO | PRESENTADO (NETO) | ESTADO     | APROBADO (NETO) |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------|
| REFUERZO MUROS PERIMETRALES DEL PROYECTO                 |             | UF 240,55         | APROBADO   | UF 91,90        |
| CAMBIO DE HORMIGÓN DE G20 A G25                          |             | UF 731,44         | ELIMINADA  | UF 00,00        |
| DEMOLICION VIGA DE CONTENCIÓN Y FUNDACION MURO MEDIANERO |             | UF 200,39         | APROBADO   | UF 181,62       |
| CAMBIO DE CANTERÍA DE BAÑO POR CORNISA                   |             | -UF 29,65         | APROBADO   | -UF 32,62       |
| SOBREEXCAVACION Y RELLENOS EN FUNDACIONES                |             | UF 161,40         | RECHAZADO  | UF 00,00        |
| MODIFICACION DE LOSA DEL 1° SUBTERRANEO                  |             | UF 363,00         | APROBADO   | UF 345,26       |
| EMPALME UD Y ALCANTARILLADO                              |             | UF 184,07         | APROBADO   | UF 184,07       |
| ESTANQUE DE AGUA DE BOMBEROS                             |             | UF 412,70         | APROBADO   | UF 210,27       |
| JUNTA DE DILATACIÓN DE PISCINA                           |             | UF 40,96          | APROBADO   | UF 40,96        |
| MOTOR CORTINA SALA DE VENTAS                             |             | UF 59,21          | APROBADO   | UF 59,21        |
| CAMBIO DE TINA A RECEPTACULO DEPTOS TIPO 1-3-5-8         |             | UF 507,32         | APROBADO   | UF 507,32       |
| COSTO DIRECTO OBRAS EXTRAORDINARIAS N°5 y N°9            |             | UF 1.500,00       | APROBADO   | UF 212,68       |
| ESTANQUE DE AGUA DE BOMBEROS                             |             | UF 421,70         | APROBADO   | UF 38,63        |
| COSTOS DIRECTOS OOAA 05 y 09                             |             | UF 56,87          | APROBADO   | UF 42,16        |
| VARIOS VENTANAS                                          |             | UF 242,52         | APROBADO   | UF 242,52       |
| ALARMA VENTANAS DORMITORIOS PISO 2                       |             | UF 37,71          | APROBADO   | UF 37,71        |
| CIERRE SEGURIDAD SALA DE VENTAS                          |             | UF 14,89          | APROBADO   | UF 14,89        |
| SALA DE VENTAS                                           |             | UF 126,31         | APROBADO   | UF 126,31       |
| VENTANAS LOCALES 9 AL 13                                 |             | UF 35,88          | APROBADO   | UF 35,88        |
|                                                          |             |                   | TOTAL NETO | UF 2.338,77     |
|                                                          |             |                   | IVA        | 19,00 %         |
|                                                          |             |                   | CEEC       | 65,00 %         |
|                                                          |             |                   | TOTAL      | UF 2.494,30     |

|                  |             |                      |             |                       |           |
|------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| ADIC. A LA FECHA | UF 2.494,30 | ADIC. PAGADO A FECHA | UF 2.260,68 | TOTAL SALDO POR PAGAR | UF 233,62 |
|------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------|

|           |              |                                                          |               |            |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|
| TIPO OBRA | CONSTRUCCION | INFORME EJECUTIVO<br>SEPTIEMBRE 2026<br>EDIFICIO CARRERA | Nº            | 19         |
| CODIGO    | GIP_228      |                                                          | FECHA INFORME | 05-10-2026 |
| M²        | 11.180,05    |                                                          | REV.          | 0          |

#### 1.5 ESTADOS DE PAGO ADICIONALES

| FECHA      | Nº EP | FACTURA Nº | TOTAL     | RETENCIONES | DEVOLUCION ANTICIPO | MONTO PAGO NETO |
|------------|-------|------------|-----------|-------------|---------------------|-----------------|
| 23-06-2025 | 1     | 40770      | UF 45,95  | UF 00,00    |                     | UF 45,95        |
| 29-08-2025 | 2     | 40985      | UF 90,81  | UF 00,00    |                     | UF 90,81        |
| 30-10-2025 | 3     | 41211      | UF 136,76 | UF 00,00    |                     | UF 136,76       |
| 27-11-2025 | 4     | 41350      | UF 345,26 | UF 00,00    |                     | UF 345,26       |
| 16-04-2026 | 5     | 41796      | UF 184,07 | UF 00,00    |                     | UF 184,07       |
| 20-07-2026 | 6     | 42274      | UF 216,67 | UF 00,00    |                     | UF 216,67       |
| 20-08-2026 | 7     | 42373      | UF 939,83 | UF 00,00    |                     | UF 939,83       |
| 20-09-2026 | 8     | 42497      | UF 160,37 | UF 00,00    |                     | UF 160,37       |
| TOTAL NETO |       |            |           |             |                     | UF 2.119,72     |
| TOTAL      |       |            |           |             |                     | UF 2.260,68     |

#### 1.6 ESTADOS DE PAGO ORDINARIO


| FECHA      | Nº EP                      | FACTURA Nº | TOTAL         | RETENCIONES  | DEVOLUCION ANTICIPO | MONTO PAGO NETO |
|------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 11-02-2025 | ANTICIPO 1 CEEC            | 40224      | UF 22.414,52  | UF 00,00     | UF 00,00            | UF 22.414,52    |
| 11-02-2025 | ANTICIPO 1 SIN CEEC        | 40225      | UF 1.514,15   | UF 00,00     | UF 00,00            | UF 1.514,15     |
| 26-02-2025 | ESTADO DE PAGO 1 CEEC      | 40343      | UF 10.065,51  | UF 503,28    | UF 738,35           | UF 8.823,89     |
| 24-03-2025 | ESTADO DE PAGO 2 CEEC      | 40401      | UF 5.272,05   | UF 263,60    | UF 386,73           | UF 4.621,73     |
| 20-04-2025 | ESTADO DE PAGO 3 CEEC      | 40551      | UF 10.540,18  | UF 527,01    | UF 773,16           | UF 9.240,01     |
| 20-04-2025 | NOTA DE CREDITO 1 CEEC     | 3999       | -UF 8.128,07  | -UF 406,40   | -UF 596,23          | -UF 7.125,44    |
| 20-05-2025 | ANTICIPO 2 CEEC            | 40643      | UF 22.414,52  | UF 00,00     | UF 00,00            | UF 22.414,52    |
| 20-05-2025 | ANTICIPO 2 SIN CEEC        | 40644      | UF 1.514,15   | UF 00,00     | UF 00,00            | UF 1.514,15     |
| 20-05-2025 | ESTADO DE PAGO 4 CEEC      | 40649      | UF 3.391,08   | UF 169,55    | UF 248,75           | UF 2.972,78     |
| 20-06-2025 | ESTADO DE PAGO 5 CEEC      | 40735      | UF 8.165,75   | UF 408,29    | UF 1.261,44         | UF 6.496,03     |
| 21-07-2025 | ESTADO DE PAGO 6 CEEC      | 40854      | UF 6.866,38   | UF 343,32    | UF 1.060,71         | UF 5.462,35     |
| 20-08-2025 | ESTADO DE PAGO 7 CEEC      | 40961      | UF 7.636,21   | UF 381,81    | UF 1.179,63         | UF 6.074,77     |
| 20-09-2025 | ESTADO DE PAGO 8 CEEC      | 41066      | UF 9.273,15   | UF 463,66    | UF 1.432,50         | UF 7.377,00     |
| 20-09-2025 | ESTADO DE PAGO 1 SIN CEEC  | 41065      | UF 1.161,88   | UF 58,09     | UF 170,46           | UF 933,33       |
| 20-10-2025 | ESTADO DE PAGO 9 CEEC      | 41158      | UF 8.286,51   | UF 414,33    | UF 1.280,09         | UF 6.592,09     |
| 20-10-2025 | ESTADO DE PAGO 2 SIN CEEC  | 41167      | UF 1.920,36   | UF 96,02     | UF 281,73           | UF 1.542,61     |
| 20-11-2025 | ESTADO DE PAGO 10 CEEC     | 41265      | UF 9.856,93   | UF 492,85    | UF 1.522,68         | UF 7.841,40     |
| 20-11-2025 | ESTADO DE PAGO 3 SIN CEEC  | 41266      | UF 3.008,54   | UF 150,43    | UF 441,38           | UF 2.416,74     |
| 20-12-2025 | ESTADO DE PAGO 11 CEEC     | 41414      | UF 11.432,82  | UF 571,64    | UF 1.766,13         | UF 9.095,05     |
| 20-12-2025 | ESTADO DE PAGO 4 SIN CEEC  | 41413      | UF 272,87     | UF 13,64     | UF 40,03            | UF 219,19       |
| 20-01-2026 | ESTADO DE PAGO 12 CEEC     | 41499      | UF 12.244,28  | UF 612,21    | UF 1.891,48         | UF 9.740,58     |
| 20-01-2026 | ESTADO DE PAGO 5 SIN CEEC  | 41500      | UF 397,96     | UF 19,90     | UF 58,38            | UF 319,68       |
| 20-02-2026 | ESTADO DE PAGO 13 CEEC     | 41616      | UF 14.356,50  | UF 717,82    | UF 2.217,77         | UF 11.420,90    |
| 20-02-2026 | ESTADO DE PAGO 6 SIN CEEC  | 41615      | UF 741,38     | UF 37,07     | UF 108,77           | UF 595,54       |
| 20-03-2026 | ESTADO DE PAGO 14 CEEC     | 41709      | UF 17.028,34  | UF 851,42    | UF 2.630,51         | UF 13.546,41    |
| 20-03-2026 | ESTADO DE PAGO 7 SIN CEEC  | 41710      | UF 441,28     | UF 22,06     | UF 64,74            | UF 354,48       |
| 20-04-2026 | ESTADO DE PAGO 15 CEEC     | 41951      | UF 13.937,56  | UF 696,88    | UF 2.153,05         | UF 11.087,62    |
| 20-04-2026 | ESTADO DE PAGO 8 SIN CEEC  | 41952      | UF 481,50     | UF 24,08     | UF 70,64            | UF 386,79       |
| 20-05-2026 | ESTADO DE PAGO 16 CEEC     | 42049      | UF 13.428,33  | UF 671,42    | UF 2.074,39         | UF 10.682,52    |
| 20-05-2026 | ESTADO DE PAGO 9 SIN CEEC  | 42048      | UF 600,86     | UF 30,04     | UF 88,15            | UF 482,67       |
| 20-06-2026 | ESTADO DE PAGO 17 CEEC     | 42172      | UF 19.319,30  | UF 965,97    | UF 2.984,42         | UF 15.368,92    |
| 20-06-2026 | ESTADO DE PAGO 10 SIN CEEC | 42171      | UF 718,04     | UF 35,90     | UF 105,34           | UF 576,79       |
| 20-07-2026 | ESTADO DE PAGO 18 CEEC     | 42271      | UF 18.315,51  | UF 915,78    | UF 2.829,35         | UF 14.570,38    |
| 20-07-2026 | ESTADO DE PAGO 11 SIN CEEC | 42269      | UF 957,39     | UF 47,87     | UF 140,46           | UF 769,07       |
| 20-08-2026 | ESTADO DE PAGO 19 CEEC     | 42372      | UF 19.315,21  | UF 965,76    | UF 2.983,79         | UF 15.365,66    |
| 20-08-2026 | ESTADO DE PAGO 12 SIN CEEC | 42371      | UF 1.332,72   | UF 66,64     | UF 195,52           | UF 1.070,56     |
| 20-09-2026 | ESTADO DE PAGO 20 CEEC     | 42495      | UF 16.717,49  | UF 835,87    | UF 2.582,49         | UF 13.299,13    |
| 20-09-2026 | ESTADO DE PAGO 13 SIN CEEC | 42494      | UF 1.827,32   | UF 91,37     | UF 268,08           | UF 1.467,87     |
|            |                            |            | UF 289.040,47 | UF 12.059,16 | UF 35.434,86        | UF 241.546,45   |
| TOTAL NETO |                            |            |               |              |                     | UF 241.546,45   |
| TOTAL      |                            |            |               |              |                     | UF 259.358,50   |

|            |               |                |               |                       |              |
|------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| A LA FECHA | UF 350.450,13 | PAGADO A FECHA | UF 259.358,50 | TOTAL SALDO POR PAGAR | UF 91.091,63 |
|------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|

|           |              |                                                          |               |            |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|
| TIPO OBRA | CONSTRUCCION | INFORME EJECUTIVO<br>SEPTIEMBRE 2026<br>EDIFICIO CARRERA | Nº            | 19         |
| CODIGO    | GIP_228      |                                                          | FECHA INFORME | 05-10-2026 |
| M²        | 11.180,05    |                                                          | REV.          | 0          |

## 2. AVANCES DE LA OBRA

|                       |   |         |                        |      |
|-----------------------|---|---------|------------------------|------|
| PROGRAMADO A LA FECHA | % | 71,62 % | Dias Adelanto / Atraso | 5,00 |
| EJECUTADO A LA FECHA  | % | 72,49 % |                        |      |

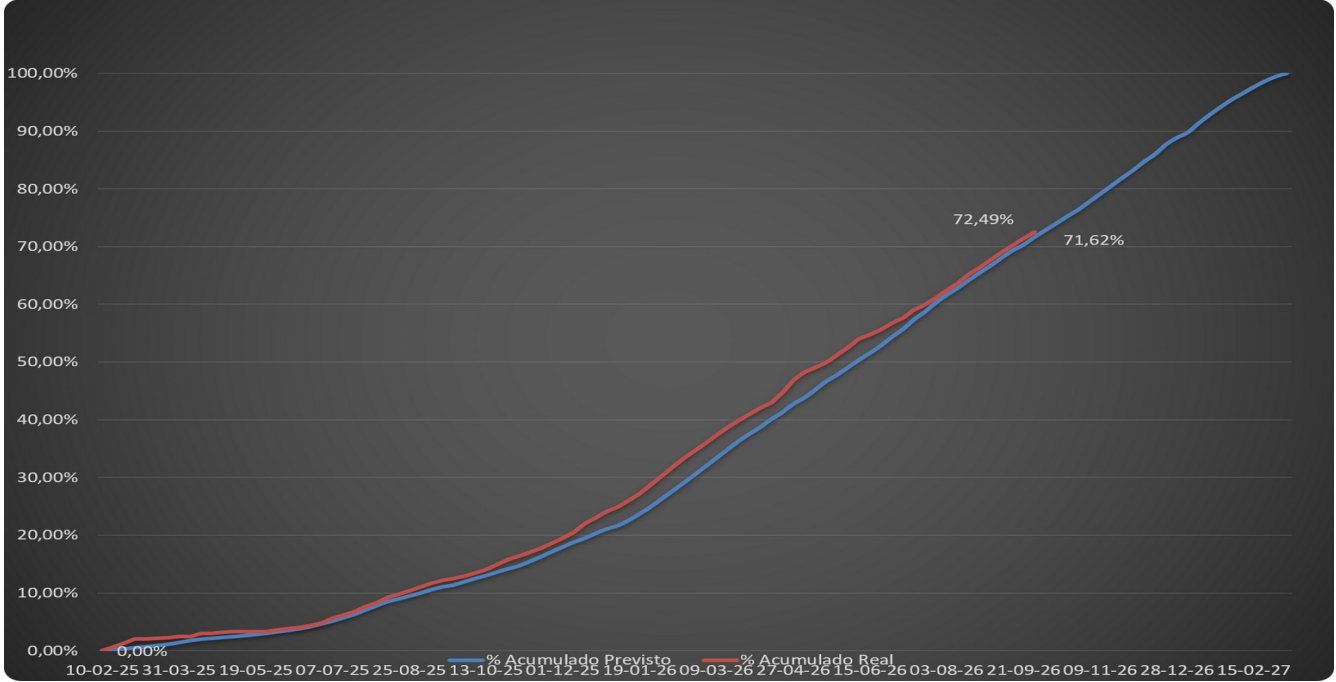

### HITOS CONTRACTUALES

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. SELLO DE EXCAVACION    | 29-05-2025                                                  |
| 2. LLEGADA A COTA 0       | 02-02-2026                                                  |
| 3. TERMINO DE OBRA GRUESA | 10-06-2026                                                  |
| 4. TERMINO DEPTO PILOTO   | 29-05-2026 (Acuerdo Reunión de Obras).                      |
| 5. RECEPCION PROVISORIA   | Pendiente indicacion de fecha por parte de la Constructora. |

### HECHOS RELEVANTES SEPTIEMBRE 2026

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE SE ADJUDICAN A LA EMPRESA GEN LAS OBRAS DEL PROYECTO SERVIU.                                          |
| 2. CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE SE PRESENTAN EL ESTADO DE PAGO N°20 Y EL ESTADO DE PAGO N°08 DE OBRAS ADICIONALES.                    |
| 3. CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE SE INFORMAN 100% SUBSANADAS LAS OBSERVACIONES DE METROGAS AL INTERIOR DEL EDIFICIO.                   |
| 4. CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE SE APRUEBAN PORCELANATO SHELLSTONE BIANCO (PISCINA) Y PISO POLINWOOD CON GUARDAPOLVO GRIS (BOMBEROS). |
| 5. CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE SE TERMINA LA CONFIGURACION DE TABIQUERIA INTERIOR DE DEPARTAMENTOS DEL PISO 12°.                     |

|           |              |                                                          |               |            |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|
| TIPO OBRA | CONSTRUCCION | INFORME EJECUTIVO<br>SEPTIEMBRE 2026<br>EDIFICIO CARRERA | Nº            | 19         |
| CODIGO    | GIP_228      |                                                          | FECHA INFORME | 05-10-2026 |
| M²        | 11.180,05    |                                                          | REV.          | 0          |

### 3. REGISTRO FOTOGRAFICO al 30.09.2026



FACHADA INTERIOR INICIO DEL MES



FACHADA INTERIOR FINAL DEL MES



INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA PISOS 6º Y 7º



IMPERMEABILIZACION Y CERAMICA DE TERRAZAS PISOS 9º Y 10º



TRABAJOS EN CUBIERTA INICIO DEL MES



TRABAJOS EN CUBIERTA FIN DE MES

|                  |              |                                                                               |                      |            |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>TIPO OBRA</b> | CONSTRUCCION | <b>INFORME EJECUTIVO</b><br><b>SEPTIEMBRE 2026</b><br><b>EDIFICIO CARRERA</b> | <b>Nº</b>            | 19         |
| <b>CODIGO</b>    | GIP_228      |                                                                               | <b>FECHA INFORME</b> | 05-10-2026 |
| <b>M²</b>        | 11.180,05    |                                                                               | <b>REV.</b>          | 0          |



TABQUERIA 1º PISO (LOCALES / SECTOR BOMBEROS)



TERMINACION DE DEPARTAMENTOS DEL 4º PISO

#### 4. CALIDAD DE OBRA

- SE TERMINA REVISION DE IMPERMEABILIZACION DEL PISO 8º Y SE INICIA LA DEL PISO 10º.
- SE REALIZA RECEPCION R0 DE DEPARTAMENTOS DEL 3º PISO, CON 14 DEPARTAMENTOS REVISADOS AL 29.09.
- SE REVISAN Y SOLUCIONAN EN TERRENO CON ARQUITECTURA LAS OBSERVACIONES A CORNISAS DE PASILLOS COMUNES.
- SE SOLICITA A LA CONSTRUCTORA REVISAR TERMINACIONES DE JUNQUILLOS Y SELLOS DE PUERTAS CORREDERAS.

#### 5. SEGURIDAD E HIGIENE

- CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE SE ACCIDENTA UN CARPINTERO MIENTRAS DESARMABA UN ANDAMIO, CON 7 DIAS PERDIDOS. A LA FECHA LA OBRA REGISTRA DOS ACCIDENTES Y 7 DIAS PERDIDOS.

#### 6. ANEXOS

|                       |              |            |            |            |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>ESTATUS DE RDI</b> | <b>TOTAL</b> | <b>324</b> | RESUELTAS  | <b>311</b> |
|                       |              |            | PENDIENTES | 13         |
|                       |              |            | NULAS      | 0          |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>ANEXO CONTROL PRESUPUESTARIO</b> | <b>SI</b> |
|-------------------------------------|-----------|

CLIENTE: INMOBILIARIA RUTA DESARROLLO CUATRO SPA  
EDIFICIO CARRERA



**MATERIA:** Construcción

|             |                                                | MONTO CONTRATO<br>(UF) | MONTO<br>ACTUALIZADO<br>(UF) | MONTO FACTURADO<br>(UF) | SALDO<br>(UF)    |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>ITEM</b> | <b>Descripción</b>                             | <b>350.450,13</b>      | <b>350.450,13</b>            | <b>259.358,50</b>       | <b>91.091,63</b> |
| A.3         | Contrato de Construcción Suma Alzada C/IVA 19% | 350.450,13             | 350.450,13                   | 259.358,50              | 91.091,63        |
|             |                                                |                        |                              |                         |                  |
| A.4         | Modificaciones de obra Construcción            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                    | 0,00             |

---

VºBº **Juan Carlos Neira**  
02-10-2026

CLIENTE: INMOBILIARIA RUTA DESARROLLO CUATRO SPA  
EDIFICIO CARRERA



|          |                  |
|----------|------------------|
| MATERIA: | Resumen Contrato |
|----------|------------------|

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Resumen del Contrato:</b>                   |                   |
| Tipo de Contrato                               | SUMA ALZADA       |
| Monto del Contrato (UF) C/ IVA Especial 11,00% |                   |
| Monto del Contrato (UF) C/ IVA 19,00%          |                   |
| <b>Monto Total Contrato C/IVA</b>              | <b>350.450,13</b> |
| Aumentos y Disminuciones                       | 0,00              |
| Anticipo 1 (UF)                                | 23.928,67         |
| Anticipo 2 (UF)                                | 23.928,67         |
| Póliza de Seguros (UF)                         | 17.523            |
| Plazo de Ejecución (Días)                      | 752               |
| Fecha de Inicio                                | 11-02-2025        |
| Fecha de Término                               | 05-03-2027        |
| <b>MONTO ANTICIPO DEVUELTO CONSTRUCTORA</b>    | <b>35.434,86</b>  |

| BOLETAS DE GARANTÍAS - EDIFICIO CARRERA |               |                   |             |            |                |                             |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------|----------------|-----------------------------|
| INSTITUCIÓN                             | NUMERO BOLETA | CONCEPTO          | VENCIMIENTO | MONTO (UF) | Monto Devuelto | OBSERVACION                 |
| AVLA                                    | 3012024201547 | Anticipo          | 22-01-2027  | 5.141,39   | 5.141,39       | DEVOLUCION BOLETA 1 DE 10.  |
| AVLA                                    | 3012024201548 | Anticipo          | 22-01-2027  | 5.141,39   | 5.141,39       | DEVOLUCION BOLETA 2 DE 10.  |
| AVLA                                    | 3012024201550 | Anticipo          | 22-01-2027  | 5.141,39   | 5.141,39       | DEVOLUCION BOLETA 3 DE 10.  |
| AVLA                                    | 3012024201551 | Anticipo          | 22-01-2027  | 5.141,39   | 5.141,39       | DEVOLUCION BOLETA 4 DE 10.  |
| AVLA                                    | 3012024201552 | Anticipo          | 22-01-2027  | 5.141,39   |                |                             |
| AVLA                                    | 3012024201553 | Anticipo          | 22-01-2027  | 5.141,39   |                |                             |
| AVLA                                    | 3012024201555 | Anticipo          | 22-01-2027  | 5.141,39   |                |                             |
| AVLA                                    | 3012024201556 | Anticipo          | 22-01-2027  | 5.141,39   |                |                             |
| AVLA                                    | 3012024201557 | Anticipo          | 22-01-2027  | 5.141,39   |                |                             |
| AVLA                                    | 3012024201558 | Anticipo          | 22-01-2027  | 5.141,39   |                |                             |
| AVLA                                    | 3012024201545 | Fiel Cumplimiento | 19-02-2027  | 17.522,51  |                | EN PODER DE LA INMOBILIARIA |

VºBº Juan Carlos Neira  
02-10-2026

CLIENTE: INMOBILIARIA RUTA DESARROLLO CUATRO SPA  
 EDIFICIO CARRERA



| ESTADOS DE PAGO IVA CREDITO ESPECIAL |            |                      |
|--------------------------------------|------------|----------------------|
| MATERIA: Contrato de Construcción    |            |                      |
|                                      |            |                      |
| Monto Estimado Inicial               |            |                      |
| Monto TOTAL Contratado               |            |                      |
| Costo Directo                        | 266.348,29 |                      |
| Gastos Generales                     | 38.519,04  | 14,46 %              |
| Gasto Oficina (4%)                   | 12.194,69  | 4,00 %               |
| Margen (3%)                          | 9.146,02   | 3,00 %               |
| Administración Valores Proforma 3%   |            |                      |
| Subtotal Neto                        | 326.208,05 | 47.857,34 Total      |
| IVA NORMAL                           | 19,00 %    | 61.979,53            |
| CREDITO IVA                          | 65,00 %    | 37.737,44            |
| TOTAL CONTRATO (IVA INC)             | 350.450,13 | 23.928,67 Anticipo 1 |
|                                      |            | 23.928,67 Anticipo 2 |

|          |        |      |
|----------|--------|------|
|          | 7,34 % | 15 % |
|          |        |      |
| Etapas 2 | 5 %    | 5 %  |

| ESTADO DE PAGO N° | EMITIDA POR          | N° FACTURA | FECHA EMISION | GLOSA                      | MONTO BRUTO NETO ESTADO DE PAGO (UF) | DEVOLUCION ANTICIPO 1 14,16% (UF) | DEVOLUCION ANTICIPO 2 14,16% (UF) | RETENCIONES POR CONTRATO (UF) | MONTO NETO ESTADO DE PAGO (UF) | IVA A PAGAR (19%) (UF) | CRED ESP CEEC (65%) (UF) | MONTO ESTADO DE PAGO TOTAL (UF) | Valor UF Día de la Facturación | MONTO ESTADO DE PAGO NETO (\$) | IVA A PAGAR (19%) (\$) | CRED ESP CEEC (65%) (\$) | MONTO ESTADO DE PAGO TOTAL (\$) |
|-------------------|----------------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                   |                      |            |               |                            |                                      |                                   |                                   |                               |                                |                        |                          |                                 |                                |                                |                        |                          |                                 |
| 0                 | CONSTRUCTORA INGEVEC | 40224      | 11-02-2025    | ANTICIPO 1 CEEC            | 22.414,52                            |                                   |                                   |                               | 22.414,52                      | 4.258,76               | 2.768,19                 | 23.905,09                       | 38.391,84                      | 860.534.666                    | 163.501.586            | 106.276.031              | 917.760.221                     |
| 1                 | CONSTRUCTORA INGEVEC | 40225      | 11-02-2025    | ANTICIPO 1 SIN CEEC        | 1.514,15                             |                                   |                                   |                               | 1.514,15                       | 287,69                 |                          | 1.801,84                        | 38.391,84                      | 58.131.005                     | 11.044.891             |                          | 69.175.895                      |
| 2                 | CONSTRUCTORA INGEVEC | 40343      | 26-02-2025    | ESTADO DE PAGO 1 CEEC      | 10.065,51                            | 738,35                            |                                   | 503,28                        | 8.823,89                       | 1.676,54               | 1.089,75                 | 9.410,68                        | 38.527,33                      | 339.961.047                    | 64.592.599             | 41.985.189               | 362.568.457                     |
| 3                 | CONSTRUCTORA INGEVEC | 40401      | 24-03-2025    | ESTADO DE PAGO 2 CEEC      | 5.272,05                             | 386,73                            | -                                 | 263,60                        | 4.621,73                       | 878,13                 | 570,78                   | 4.929,07                        | 38.839,02                      | 179.503.260                    | 34.105.619             | 22.168.652               | 191.440.227                     |
| 4                 | CONSTRUCTORA INGEVEC | 40551      | 20-04-2025    | ESTADO DE PAGO 3 CEEC      | 10.540,18                            | 773,16                            | -                                 | 527,01                        | 9.240,01                       | 1.755,60               | 1.141,14                 | 9.854,47                        | 39.016,98                      | 360.517.324                    | 68.498.292             | 44.523.890               | 384.491.726                     |
| 5                 | CONSTRUCTORA INGEVEC | 3999       | 20-04-2025    | NOTA DE CREDITO 1 CEEC     | - 8.128,07                           | - 596,23                          | - -                               | - 406,40                      | - 7.125,44                     | - 1.353,83             | - 879,99                 | - 7.599,28                      | 39.016,98                      | - 278.013.013                  | - 52.822.472           | - 34.334.607             | - 296.500.878                   |
| 6                 | CONSTRUCTORA INGEVEC | 40643      | 20-05-2025    | ANTICIPO 2 CEEC            | 22.414,52                            |                                   |                                   |                               | 22.414,52                      | 4.258,76               | 2.768,19                 | 23.905,09                       | 39.161,67                      | 877.790.035                    | 166.780.107            | 108.407.070              | 936.163.072                     |
| 7                 | CONSTRUCTORA INGEVEC | 40644      | 20-05-2025    | ANTICIPO 2 SIN CEEC        | 1.514,15                             |                                   |                                   |                               | 1.514,15                       | 287,69                 |                          | 1.801,84                        | 39.161,67                      | 59.296.643                     | 11.266.362             |                          | 70.563.005                      |
| 8                 | CONSTRUCTORA INGEVEC | 40649      | 20-05-2025    | ESTADO DE PAGO 4 CEEC      | 3.391,08                             | 248,75                            |                                   | 169,55                        | 2.972,78                       | 564,83                 | 367,14                   | 3.170,47                        | 39.161,67                      | 116.418.873                    | 22.119.586             | 14.377.731               | 124.160.728                     |
| 9                 | CONSTRUCTORA INGEVEC | 40735      | 20-06-2025    | ESTADO DE PAGO 5 CEEC      | 8.165,75                             | 630,72                            | 630,72                            | 408,29                        | 6.496,03                       | 1.234,24               | 802,26                   | 6.928,01                        | 39.248,80                      | 254.961.240                    | 48.442.636             | 31.487.713               | 271.916.163                     |
| 10                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 40854      | 21-07-2025    | ESTADO DE PAGO 6 CEEC      | 6.866,38                             | 530,36                            | 530,36                            | 343,32                        | 5.462,35                       | 1.037,85               | 674,60                   | 5.825,60                        | 39.229,71                      | 214.286.540                    | 40.714.443             | 26.464.388               | 228.536.595                     |
| 11                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 40961      | 20-08-2025    | ESTADO DE PAGO 7 CEEC      | 7.636,21                             | 589,82                            | 589,82                            | 381,81                        | 6.074,77                       | 1.154,21               | 750,23                   | 6.478,74                        | 39.258,06                      | 238.483.666                    | 45.311.897             | 29.452.733               | 254.342.830                     |
| 12                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41066      | 20-09-2025    | ESTADO DE PAGO 8 CEEC      | 9.273,15                             | 716,25                            | 716,25                            | 463,66                        | 7.377,00                       | 1.401,63               | 911,06                   | 7.867,57                        | 39.485,63                      | 291.285.348                    | 55.344.216             | 35.973.740               | 310.655.824                     |
| 13                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41065      | 20-09-2025    | ESTADO DE PAGO 1 SIN CEEC  | 1.161,88                             |                                   | 170,46                            | 58,09                         | 933,33                         | 177,33                 |                          | 1.110,66                        | 39.485,65                      | 36.853.086                     | 7.002.086              |                          | 43.855.172                      |
| 14                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41158      | 20-10-2025    | ESTADO DE PAGO 9 CEEC      | 8.286,51                             | 1.280,09                          |                                   | 414,33                        | 6.592,09                       | 1.252,50               | 814,12                   | 7.030,47                        | 39.541,62                      | 260.662.052                    | 49.525.790             | 32.191.764               | 277.996.078                     |
| 15                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41167      | 20-10-2025    | ESTADO DE PAGO 2 SIN CEEC  | 1.920,36                             |                                   | 281,73                            | 96,02                         | 1.542,61                       | 293,10                 |                          | 1.835,70                        | 39.541,62                      | 60.997.167                     | 11.589.462             |                          | 72.586.629                      |
| 16                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41265      | 20-11-2025    | ESTADO DE PAGO 10 CEEC     | 9.856,93                             | 1.522,68                          |                                   | 492,85                        | 7.841,40                       | 1.489,87               | 968,41                   | 8.362,85                        | 39.643,59                      | 310.861.247                    | 59.063.637             | 38.391.364               | 331.533.520                     |
| 17                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41266      | 20-11-2025    | ESTADO DE PAGO 3 SIN CEEC  | 3.008,54                             |                                   | 441,38                            | 150,43                        | 2.416,74                       | 459,18                 |                          | 2.875,92                        | 39.643,59                      | 95.808.137                     | 18.203.546             |                          | 114.011.683                     |
| 18                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41414      | 20-12-2025    | ESTADO DE PAGO 11 CEEC     | 11.432,82                            | 1.766,13                          |                                   | 571,64                        | 9.095,05                       | 1.728,06               | 1.123,24                 | 9.699,87                        | 39.685,75                      | 360.944.001                    | 68.579.360             | 44.576.584               | 384.946.777                     |
| 19                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41413      | 20-12-2025    | ESTADO DE PAGO 4 SIN CEEC  | 272,87                               |                                   | 40,03                             | 13,64                         | 219,19                         | 41,65                  |                          | 260,84                          | 39.685,75                      | 8.698.845                      | 1.652.781              |                          | 10.351.626                      |
| 20                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41499      | 20-01-2026    | ESTADO DE PAGO 12 CEEC     | 12.244,28                            | 1.891,48                          | -                                 | 612,21                        | 9.740,58                       | 1.850,71               | 1.202,96                 | 10.388,33                       | 39.734,28                      | 387.035.117                    | 73.536.672             | 47.798.837               | 412.772.952                     |
| 21                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41500      | 20-01-2026    | ESTADO DE PAGO 5 SIN CEEC  | 397,96                               |                                   | 58,38                             | 19,90                         | 319,68                         | 60,74                  |                          | 380,42                          | 39.734,28                      | 12.702.227                     | 2.413.423              |                          | 15.115.650                      |
| 22                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41616      | 20-02-2026    | ESTADO DE PAGO 13 CEEC     | 14.356,50                            | 2.217,77                          | -                                 | 717,82                        | 11.420,90                      | 2.169,97               | 1.410,48                 | 12.180,39                       | 39.745,27                      | 453.926.778                    | 86.246.088             | 56.059.957               | 484.112.909                     |
| 23                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41615      | 20-02-2026    | ESTADO DE PAGO 6 SIN CEEC  | 741,38                               |                                   | 108,77                            | 37,07                         | 595,54                         | 113,15                 |                          | 708,69                          | 39.745,27                      | 23.669.965                     | 4.497.293              |                          | 28.167.258                      |
| 24                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41709      | 20-03-2026    | ESTADO DE PAGO 14 CEEC     | 17.028,34                            | 2.630,51                          |                                   | 851,42                        | 13.546,41                      | 2.573,82               | 1.672,98                 | 14.447,24                       | 39.841,72                      | 539.712.226                    | 102.545.323            | 66.654.460               | 575.603.089                     |
| 25                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41710      | 20-03-2026    | ESTADO DE PAGO 7 SIN CEEC  | 441,28                               |                                   | 64,74                             | 22,06                         | 354,48                         | 67,35                  |                          | 421,83                          | 39.841,72                      | 14.123.053                     | 2.683.380              |                          | 16.806.433                      |
| 26                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41951      | 20-04-2026    | ESTADO DE PAGO 15 CEEC     | 13.937,56                            | 2.153,05                          |                                   | 696,88                        | 11.087,62                      | 2.106,65               | 1.369,32                 | 11.824,95                       | 39.987,35                      | 443.364.711                    | 84.239.295             | 54.755.542               | 472.848.464                     |
| 27                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41952      | 20-04-2026    | ESTADO DE PAGO 8 SIN CEEC  | 481,50                               |                                   | 70,64                             | 24,08                         | 386,79                         | 73,49                  |                          | 460,28                          | 39.987,35                      | 15.466.641                     | 2.938.662              |                          | 18.405.303                      |
| 28                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 42049      | 20-05-2026    | ESTADO DE PAGO 16 CEEC     | 13.428,33                            | 2.074,39                          |                                   | 671,42                        | 10.682,52                      | 2.029,68               | 1.319,29                 | 11.392,91                       | 40.424,99                      | 431.840.952                    | 82.049.781             | 53.332.358               | 460.558.375                     |
| 29                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 42048      | 20-05-2026    | ESTADO DE PAGO 9 SIN CEEC  | 600,86                               |                                   | 88,15                             | 30,04                         | 482,67                         | 91,71                  |                          | 574,38                          | 40.424,99                      | 19.511.859                     | 3.707.253              |                          | 23.219.112                      |
| 30                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 42172      | 20-06-2026    | ESTADO DE PAGO 17 CEEC     | 19.319,30                            | 2.984,42                          |                                   | 965,97                        | 15.368,92                      | 2.920,09               | 1.898,06                 | 16.390,95                       | 40.793,13                      | 626.946.339                    | 119.119.804            | 77.427.873               | 668.638.270                     |
| 31                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 42171      | 20-06-2026    | ESTADO DE PAGO 10 SIN CEEC | 718,04                               |                                   | 105,34                            | 35,90                         | 576,79                         | 109,59                 |                          | 686,38                          | 40.793,13                      | 23.529.192                     | 4.470.546              |                          | 27.998.738                      |
| 32                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 42271      | 20-07-2026    | ESTADO DE PAGO 18 CEEC     | 18.315,51                            | 2.829,35                          |                                   | 915,78                        | 14.570,38                      | 2.768,37               | 1.799,44                 | 15.539,31                       | 40.844,79                      | 595.124.259                    | 113.073.609            | 73.497.846               | 634.700.022                     |
| 33                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 42269      | 20-07-2026    | ESTADO DE PAGO 11 SIN CEEC | 957,39                               |                                   | 140,46                            | 47,87                         | 769,07                         | 146,12                 |                          | 915,19                          | 40.844,79                      | 31.412.379                     | 5.968.352              |                          | 37.380.731                      |
| 34                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 42372      | 20-08-2026    | ESTADO DE PAGO 19 CEEC     | 19.315,21                            | 2.983,79                          |                                   | 965,76                        | 15.365,66                      | 2.919,48               | 1.897,66                 | 16.387,48                       | 40.859,28                      | 627.829.858                    | 119.287.073            | 77.536.987               | 669.580.544                     |
| 35                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 42371      | 20-08-2026    | ESTADO DE PAGO 12 SIN CEEC | 1.332,72                             |                                   | 195,52                            | 66,64                         | 1.070,56                       | 203,41                 |                          | 1.273,97                        | 40.859,28                      | 43.742.405                     | 8.311.057              |                          | 52.053.462                      |
| 36                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 42495      | 20-09-2026    | ESTADO DE PAGO 20 CEEC     | 16.717,49                            | 2.582,49                          |                                   | 835,87                        | 13.299,13                      | 2.526,83               | 1.642,44                 | 14.183,52                       | 40.975,41                      | 544.937.120                    | 103.538.053            | 67.299.734               | 581.175.439                     |
| 37                | CONSTRUCTORA INGEVEC | 42494      | 20-09-2026    | ESTADO DE PAGO 13 SIN CEEC | 1.827,32                             |                                   | 268,08                            | 91,37                         | 1.467,77                       | 278,90                 |                          | 1.746,77                        | 40.975,41                      | 60.146.739                     | 11.427.880             |                          | 71.574.619                      |
|                   |                      |            |               |                            |                                      | -                                 | -                                 | -                             | -                              | -                      | -                        | -                               | -                              | -                              | -                      | -                        | -                               |
|                   |                      |            |               | Total Facturado            | 289.040,47                           | 30.934,05                         | 4.500,82                          | 12.059,16                     | 241.546,45                     | 45.893,83              | 28.081,78                | 259.358,50                      |                                | 9.603.002.988                  | 1.824.570.568          | 1.116.305.836            | 10.311.267.720                  |

| RESUMEN                          |            |  |
|----------------------------------|------------|--|
| Monto total contrato actualizado | 350.450,13 |  |
| Monto Aprobado y Facturado       | 259.358,50 |  |
| Saldo por pagar                  | 91.091,63  |  |

[Listado de Valores Proforma Construcción](#)





ESTADOS DE PAGO EXTRAORDINARIOS  
MATERIA: Contrato de Construcción Suma Alzada C/IVA 19%

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Monto Estimado Inicial   | 2.119,72 |
| Monto TOTAL Contratado   | 2.119,72 |
| Subtotal Neto            | 2.119,72 |
| IVA NORMAL 19,00 %       | 402,75   |
| CREDITO IVA 65,00 % -    | 261,79   |
| TOTAL CONTRATO (IVA INC) | 2.260,68 |

|         |      |
|---------|------|
| Etapa 1 | 15 % |
| Etapa 2 | 5 %  |

| ESTADO DE PAGO N° | EMITIDA POR          | N° FACTURA | FECHA EMISIÓN | FECHA RECEP. | FECHA ENVÍO | GLOSA                    | MONTO BRUTO NETO ESTADO DE PAGO (UF) | DEVOLUCION ANTICIPO (UF) | RETENCIONES POR CONTRATO (UF) | MONTO NETO ESTADO DE PAGO (UF) | IVA A PAGAR (19%) | CRED ESP CEEC (65%) (UF) | TOTAL A PAGAR (UF) | Valor UF Día de la Facturación | MONTO ESTADO DE PAGO NETO (\$) | IVA A PAGAR (19%) (\$) | CRED ESP CEEC (65%) (\$) | MONTO ESTADO DE PAGO TOTAL (\$) |
|-------------------|----------------------|------------|---------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1                 | CONSTRUCTORA INGEVEC | 40770      | 23-06-2025    | 23-06-2025   | 23-06-2025  | ESTADO DE PAGO 01 OO.AA. | 45,95                                | -                        | -                             | 45,95                          | 8,73              | 5,67                     | 49,01              | 39.248,77                      | 1.803.481                      | 342.661                | 222.730                  | 1.923.412                       |
| 2                 | CONSTRUCTORA INGEVEC | 40985      | 29-08-2025    | 29-08-2025   | 29-08-2025  | ESTADO DE PAGO 02 OO.AA. | 90,81                                | -                        | -                             | 90,81                          | 17,25             | 11,22                    | 96,85              | 39.360,32                      | 3.574.311                      | 679.119                | 441.427                  | 3.812.002                       |
| 3                 | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41211      | 24-10-2025    | 24-10-2025   | 30-10-2025  | ESTADO DE PAGO 03 OO.AA. | 136,76                               | -                        | -                             | 136,76                         | 25,98             | 16,89                    | 145,85             | 39.562,00                      | 5.410.499                      | 1.027.995              | 668.197                  | 5.770.297                       |
| 4                 | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41350      | 20-11-2025    | 20-11-2025   | 27-11-2025  | ESTADO DE PAGO 04 OO.AA. | 345,26                               | -                        | -                             | 345,26                         | 65,60             | 42,64                    | 368,22             | 39.643,59                      | 13.687.346                     | 2.600.596              | 1.690.387                | 14.597.554                      |
| 5                 | CONSTRUCTORA INGEVEC | 41796      | 16-04-2026    | 16-04-2026   | 16-04-2026  | ESTADO DE PAGO 05 OO.AA. | 184,07                               | -                        | -                             | 184,07                         | 34,97             | 22,73                    | 196,31             | 39.841,72                      | 7.333.665                      | 1.393.396              | 905.708                  | 7.821.354                       |
| 6                 | CONSTRUCTORA INGEVEC | 42274      | 20-07-2026    | 20-07-2026   | 20-07-2026  | ESTADO DE PAGO 06 OO.AA. | 216,67                               | -                        | -                             | 216,67                         | 41,17             | 26,76                    | 231,08             | 40.844,79                      | 8.849.841                      | 1.681.470              | 1.092.955                | 9.438.355                       |
| 7                 | CONSTRUCTORA INGEVEC | 42373      | 20-08-2026    | 20-08-2026   | 20-08-2026  | ESTADO DE PAGO 07 OO.AA. | 939,83                               | -                        | -                             | 939,83                         | 178,57            | 116,07                   | 1.002,33           | 40.859,28                      | 38.400.777                     | 7.296.148              | 4.742.496                | 40.954.429                      |
| 8                 | CONSTRUCTORA INGEVEC | 42497      | 20-09-2026    | 20-09-2026   | 20-09-2026  | ESTADO DE PAGO 08 OO.AA. | 160,37                               | -                        | -                             | 160,37                         | 30,47             | 19,81                    | 171,03             | 40.975,41                      | 6.571.227                      | 1.248.533              | 811.546                  | 7.008.213                       |
|                   |                      |            |               |              |             |                          |                                      | -                        | -                             | -                              | -                 | -                        | -                  |                                | -                              | -                      | -                        | -                               |
|                   |                      |            |               |              |             | Total Facturado          | 2.119,72                             | -                        | -                             | 2.119,72                       | 402,75            | 261,79                   | 2.260,68           |                                | 85.631.146                     | 16.269.918             | 10.575.447               | 91.325.618                      |

| RESUMEN                          |          |
|----------------------------------|----------|
| Monto total contrato actualizado | 2.260,68 |
| Monto Aprobado y Facturado       | 2.260,68 |
| Saldo por pagar                  | 0,00     |

[Listado de Valores Proforma Construcción](#)  
[Listado de Modificaciones de Obra Construcción](#)  
[Resumen del Contrato Construcción](#)  
[Resumen Construcción](#)  
[RESUMEN](#)

VºBº Juan Carlos Neira  
02-10-2026

CLIENTE: INMOBILIARIA RUTA DESARROLLO CUATRO SPA  
EDIFICIO CARRERA



EDIFICIO CARRERA  
MATERIA: LISTADO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES

| LISTADO DE MODIFICACIONES DE OBRA CONSTRUCCIÓN |               |                |                    |                                                          | 0,00        | 5.307,27                                             | 2.338,77                           | 2.338,77                          |           |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Nº                                             | ORIGINADO POR | SOLICITADO POR | ESPECIALIDAD       | CONCEPTO                                                 | CORRELATIVO | MONTO NETO<br>PRESENTADO POR<br>CONSTRUCTORA<br>(UF) | MONTO NETO<br>APROBADO GIP<br>(UF) | MONTO NETO<br>ACTUALIZADO<br>(UF) | ESTADO    |
| 1                                              | INGEVEC       | INGEVEC        | CALCULO            | REFUERZO MUROS PERIMETRALES DEL PROYECTO                 |             | 240,55                                               | 91,90                              | 91,90                             | APROBADO  |
| 2                                              | INGEVEC       | INGEVEC        | CALCULO            | CAMBIO DE HORMIGÓN DE G20 A G25                          |             | 731,44                                               | -                                  | -                                 | ELIMINADA |
| 3                                              | INGEVEC       | INGEVEC        | CALCULO            | DEMOLICION VIGA DE CONTENCIÓN Y FUNDACION MURO MEDIANERO |             | 200,39                                               | 181,62                             | 181,62                            | APROBADO  |
| 4                                              | INGEVEC       | INGEVEC        | ARQUITECTURA       | CAMBIO DE CANTERÍA DE BANO POR CORNISA                   |             | 29,65                                                | 32,62                              | 32,62                             | APROBADO  |
| 5                                              | INGEVEC       | INGEVEC        | MEC. SUELOS        | SOBREEXCAVACION Y RELLENOS EN FUNDACIONES                |             | 161,40                                               | -                                  | -                                 | RECHAZADO |
| 6                                              | INGEVEC       | INGEVEC        | CALCULO            | MODIFICACION DE LOSA DEL 1º SUBTERRANEO                  |             | 363,00                                               | 345,26                             | 345,26                            | APROBADO  |
| 7                                              | INGEVEC       | INGEVEC        | SANITARIO          | EMPALME UD Y ALCANTARILLADO                              |             | 184,07                                               | 184,07                             | 184,07                            | APROBADO  |
| 8                                              | INGEVEC       | INGEVEC        | SANITARIO          | ESTANQUE DE AGUA DE BOMBEROS                             | -           | 412,70                                               | 210,27                             | 210,27                            | APROBADO  |
| 9                                              | INGEVEC       | INGEVEC        | IMPERMEABILIZACIÓN | JUNTA DE DILATACIÓN DE PISCINA                           | -           | 40,96                                                | 40,96                              | 40,96                             | APROBADO  |
| 10                                             | INGEVEC       | INGEVEC        | SALA DE VENTAS     | MOTOR CORTINA SALA DE VENTAS                             | -           | 59,21                                                | 59,21                              | 59,21                             | APROBADO  |
|                                                |               | INGEVEC        | ARQUITECTURA       | CAMBIO DE TINA A RECEPTACULO DEPTOS TIPO 1-3-5-8         | -           | 507,32                                               | 507,32                             | 507,32                            | APROBADO  |
|                                                |               | INGEVEC        | GASTOS GRALES.     | COSTO DIRECTO OBRAS EXTRAORDINARIAS N°5 y N°9            | -           | 1.500,00                                             | 212,68                             | 212,68                            | APROBADO  |
|                                                |               | INGEVEC        | BOMBEROS           | ESTANQUE DE AGUA DE BOMBEROS                             | -           | 421,70                                               | 38,63                              | 38,63                             | APROBADO  |
|                                                |               | INGEVEC        | GASTOS GRALES.     | COSTOS DIRECTOS OOAA 05 y 09                             | -           | 56,87                                                | 42,16                              | 42,16                             | APROBADO  |
|                                                |               | INGEVEC        | ARQUITECTURA       | VARIOS VENTANAS                                          | -           | 242,52                                               | 242,52                             | 242,52                            | APROBADO  |
|                                                |               | INGEVEC        | ARQUITECTURA       | ALARMA VENTANAS DORMITORIOS PISO 2                       | -           | 37,71                                                | 37,71                              | 37,71                             | APROBADO  |
|                                                |               | INGEVEC        | VENTAS             | CIERRE SEGURIDAD SALA DE VENTAS                          | -           | 14,89                                                | 14,89                              | 14,89                             | APROBADO  |
|                                                |               | INGEVEC        | VENTAS             | SALA DE VENTAS                                           | -           | 126,31                                               | 126,31                             | 126,31                            | APROBADO  |
|                                                |               | INGEVEC        | ARQUITECTURA       | VENTANAS LOCALES 9 AL 13                                 | -           | 35,88                                                | 35,88                              | 35,88                             | APROBADO  |

VºBº Juan Carlos Neira  
02-10-2026

**CLIENTE: INMOBILIARIA RUTA DESARROLLO CUATRO SPA**  
**EDIFICIO CARRERA**



|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>Construcción</b><br><b>MATERIA:</b> <b>Valores Proforma</b> |
|----------------------------------------------------------------|

[illegible]

**V°B° GIP**  
02-10-2026
